

ТОО Қарағанды Су

**Информация о ходе исполнения
утвержденной инвестиционной
программы
За 3 квартала 2022 года**

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 3 квартала 2022 года

Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм	утвержденная инвестиционная программа							Причины отклонения
		Количеств о	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
			План на 2022 г	Факт за 9 мес	Отклонение	собственные	заемные	за счет иной дея-ти	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на 2022 год			647 433	170 548	-476 885	647 433	0	0	<i>Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закуп материалов. Ведутся работы по реализации мероприятий инвестиционной программы, а именно строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью работ по замене сетей.</i>
Раздел 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей	м	7 073	592 194	170 548	-421 646	592 194	0	0	
Раздел 2. Погашение основного долга			54 547	0	-54 547	54 547			
Раздел 3. Приобретение ОС	шт	1	692	0	-692	692			

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Мустафина до ул.Разина

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ермекова (от Б.Жырау до Н.Абдилова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ермекова (от Б.Жырау до Н.Абдирова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубеева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 3 квартала 2022 года

		утвержденная инвестиционная программа								Причины отклонения
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
				План на 2022 г	Факт за 9 месяцев	Откл.	Собств.	заемные	за счет иной деятельности	
	ВСЕГО на 2022 год			425 227	72 080	-353 147	425 227	0	0	<i>Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закуп материалов. Ведутся строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Погашение долга по плану в ноябре 2022 года</i>
1	Раздел 1. Реконструкция канализационных сетей	м	2 866	310 296	50 977	-259 319	310 296	0	0	
2	Раздел 2. ЭМЦ водоотведения	раб	1	25 707	21 102	-4 605	25 707			
3	Раздел 3. Погашение основного долга			89 223	0	-89 223	89 223			

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 15 мкр. д. 22-30

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 15 мкр. д. 22-30

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 16 мкр. д. 25

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года




Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 16 мкр. д. 25

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года

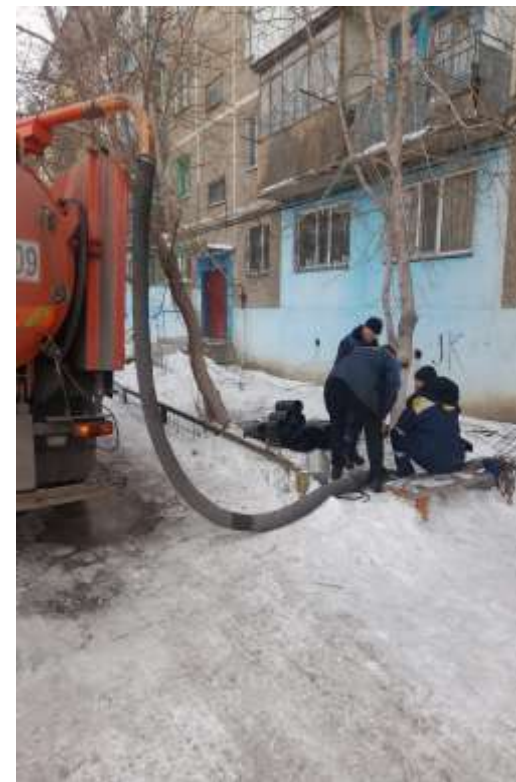

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 24

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 24

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей Сортировка ВОДЧ-7 КНС-2 (711 км) (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных коллектора по ул.Новонижня

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных коллектора по ул.Новонижня

Показатели эффективности по услуге водоснабжения

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (3 квартала), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (3 квартала)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,0%	22%	4,0%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	63,00%	62,00%	62,50%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	13,3%	13,5%	13,3%	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	999	1 360	1051	согласно плана	-

Показатели эффективности по услуге водоотведения

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (3 квартала), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (3 квартала)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3%	12%	3%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	85,0%	85%	85,0%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	13 923	20 820	14290	Рост связан с передачей сетей в доверительное управление Товариществу	-

Спасибо за внимание!
