

ТОО Қарағанды Су

**Информация о ходе исполнения
утвержденной инвестиционной
программы
За 2 квартала 2022 года**

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 2 квартала 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-изм	утвержденная инвестиционная программа							Причины отклонения
			К-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
				План на 2022 г	Факт за 6 мес	Откл-е	Собст-ные	заемные	за счет иной дея-ти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО на 2022 год			647 433	25 160	-622 273	647 433	0	0	<i>Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупка материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ.</i>
1	Раздел 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей	м	7 073	592 194	25 160	-567 034	592 194	0	0	
2	Раздел 2. Погашение основного долга			54 547	0	-54 547	54 547			
3	Раздел 3. Приобретение ОС	шт	1	692	0	-692	692			

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Мустафина до ул.Разина

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ермекова (от Б.Жырау до Н.Абдирова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гагеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гагеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гагеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 2 квартала 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм	К-во	утвержденная инвестиционная программа						Причины отклонения
				Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
				План на 2022 г	Факт за 6 мес	Откл-е	Собст-ные	заемные	за счет инной деятельно сти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО на 2022 год			425 227	58 402	-366 825	425 227	0	0	
1	Раздел 1. Реконструкция канализационных сетей	м	2 866	310 296	37 299	-272 997	310 296	0	0	<i>Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупка материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ.</i>
2	Раздел 2. ЭМЦ водоотведения	раб	1	25 707	21 102	-4 605	25 707			
3	Раздел 3. Погашение основного долга			89 223	0	-89 223	89 223			

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 15 мкр. д. 22-30

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 16 мкр. д. 25

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года




Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 16 мкр. д. 25

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года

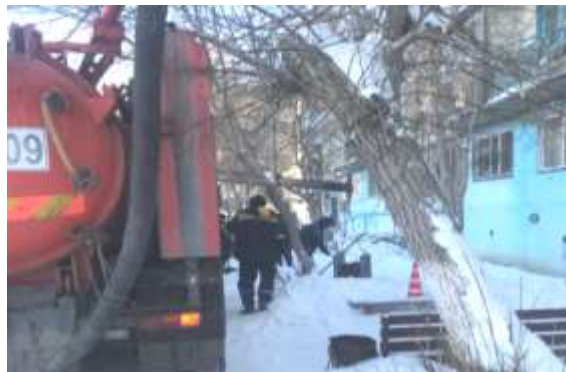

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 24

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей Сортировка ВОДЧ-7 КНС-2 (711 км) (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт канализационных коллектора по ул.Новонизжня

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года



Капитальный ремонт канализационных коллектора по ул.Новонижняя

Показатели эффективности по услуге водоснабжения

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (2 квартала), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (2 квартала)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,0%	22%	4,0%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	63,00%	62,00%	62,50%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	13,3%	13,6%	13,3%	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	493	1 360	500	согласно плана	-

Показатели эффективности по услуге водоотведения

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (2 квартала), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (2 квартала)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3%	12%	3%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	85,0%	85%	85,0%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	7 421	20 820	7 411	согласно плана	-

Спасибо за внимание!
