



ТОО Қарағанды Су

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы

За 1-ое полугодие 2023 года



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 1-ое полугодие 2023 года, тыс.тенге

Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм.	утвержденная инвестиционная программа							Причины отклонения
		Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
			План на 2023 г	Факт за 5 мес	Отклонение	Собств.	заемные	за счет иной дея-ти	
ВСЕГО на 2023 год			1 029 634	4 326	-1 025 308	1 029 634	0	0	
Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки Модернизация водоочистных сооружений	раб	1	32 419	0	-32 419	32 419			замена гидрозатворов с электроприводом, запорной арматуры D от 400 до 1000 мм. на БОС-1
Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей	м	11 045	942 668	4 326	-938 342	942 668			реконструкция участков водопроводных сетей в разных районах города Караганды
Раздел 3. Погашение основного долга			54 547	0	-54 547	54 547			погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет

Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. Заключены договоры на авторский и технический надзор.

срок погашения -декабрь 2023 года




Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Аптечная




Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года

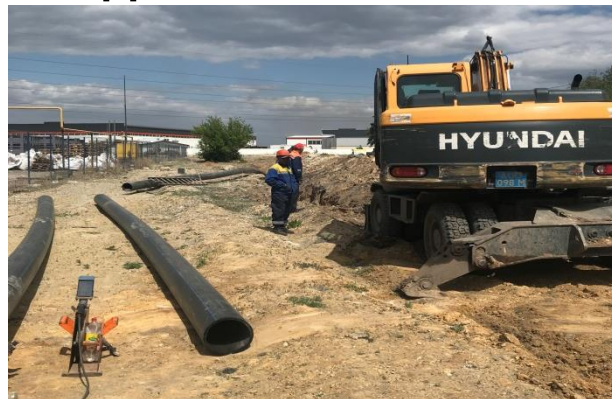

Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Бадина



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года

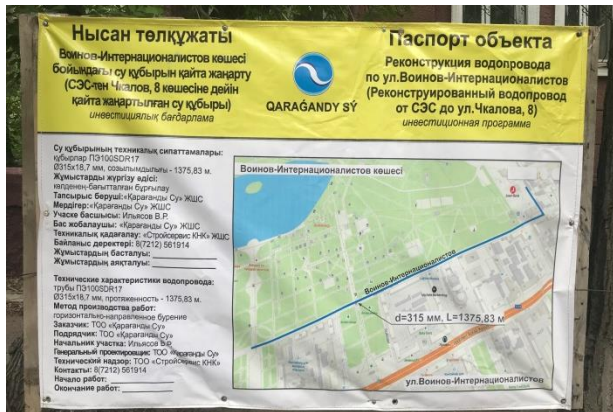

Капитальный ремонт водопроводных сетей на Воинов Интернационалистов



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Локомотивная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сантехническая




Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Совхозная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года

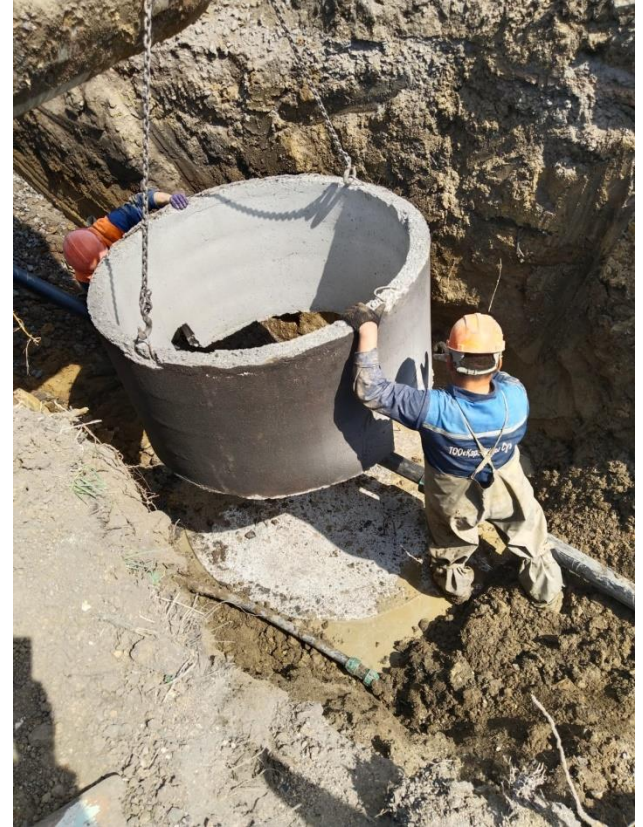

Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2023 года, тыс.тенге

Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	утвержденная инвестиционная программа								Причины отклонения
	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
			План на 2023 г	Факт за 5 мес.	Откл.	Собств.	заемные	за счет иной деятельности	
ВСЕГО на 2023 год			567 457	9 414	-558 043	567 457	0	0	
Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей	м	1 599	246 813	9 414	-237 399	246 813	0	0	<i>реконструкция участков канализационных сетей в разных районах города Караганды</i> <i>Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. Заключены договоры на авторский и технический надзор.</i>
Раздел 2. Погашение основного долга , в т.ч.			320 644	0	-320 644	320 644			
погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г. по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".			89 223						<i>срок погашения -декабрь 2023 года</i>
погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 04/01 от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г. по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".			231 421						<i>срок погашения -декабрь 2023 года</i>



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2



Благодарим за внимание!

www.kar-su.kz

