



ТОО Қарағанды Су

# **Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы**

**За 9 месяцев 2023 года**



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 9 месяцев 2023 года, тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм.	утвержденная инвестиционная программа							Пояснения	
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС				
				План на 2023 г.	Факт за 9 мес	Отклонение	собственные	заемные	за счет иной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО на 2023 год			1 419 547	158 135	-1 261 412	1 419 547	0	0		
1	Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки Модернизация водоочистных сооружений	раб	1	32 419	24 300	-8 119	32 419			замена гидрозатворов с электроприводом, запорной арматуры D от 400 до 600 мм. на БОС-1	Заключены договора на приобретение затворов дисковых D-400 мм и D-600мм, ведутся работы по их установке
2	Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей	м	16 049	1 332 581	133 835	-1 198 746	1 332 581			реконструкция участков водопроводных сетей в разных районах города Караганды	Водопровод по ул. Сурикова Водопровод по ул. Совхозной Водопроводные сети к дом.Ж/Д р-на от ВОДЧ-7 Водопровод от ЖЭК ГХК Алга Водопровод по ул. Зои Космодемьянской
3	Раздел 3. Погашение основного долга			54 547	0	-54 547	54 547			погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".	срок погашения -декабрь 2023 года



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 9 месяцев 2023 года





# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года





# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года





# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Локомотивная



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная





# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сантехническая



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Совхозная



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова




# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 9 месяцев 2023 года, тыс.тенге

Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	утвержденная инвестиционная программа								Пояснения
	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
			План на 2023 г	Факт за 5 мес.	Откл.	Собств.	заемные	за счет иной деятельности	
<b>ВСЕГО на 2023 год</b>			<b>567 457</b>	<b>9 414</b>	<b>-558 043</b>	<b>567 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей</b>	<b>м</b>	<b>1 599</b>	<b>246 813</b>	<b>9 414</b>	<b>-237 399</b>	<b>246 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>реконструкция участков канализационных сетей в разных районах города Караганды</i> <i>Кан-ция от дом 46-47 мкрн. Гульдер</i> <i>Кан-ция от дома 33-43,48-56 мкрн. Гульдер-2</i> <i>Кан-ция от КПД 44-47 22-27 мкрн. Гульдер-2</i> <i>Канализационные сети от д.57-66 мкрн.Гульдер-2</i>
<b>Раздел 2. Погашение основного долга , в т.ч.</b>			<b>320 644</b>	<b>0</b>	<b>-320 644</b>	<b>320 644</b>			
погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".			89 223						<i>срок погашения -декабрь 2023 года</i>
погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 04/01от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".			231 421						<i>срок погашения -декабрь 2023 года</i>



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года

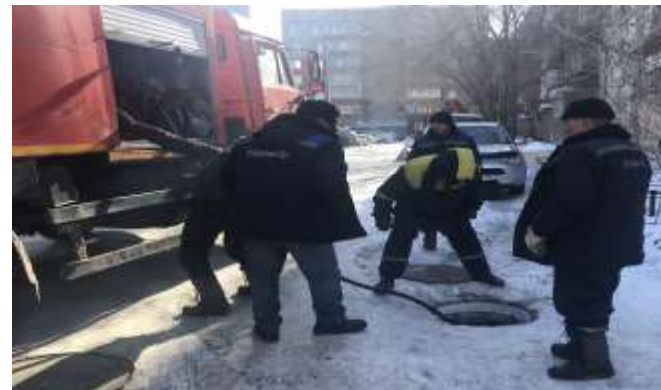

Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2





# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года



Капитальный ремонт главного коллектора по ул.Бакинской



**Благодарим за внимание!**

*[www.kar-su.kz](http://www.kar-su.kz)*

