

**Информация о ходе исполнения
утвержденной инвестиционной
программы
За 4 квартала 2022 года**



ҚАРАҒАНДЫ СУ

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед.изм.	Утвержденная ИП 2022 года (приказ № 40-ОД от 28.02.22 г.) на 2022 г.		Корректировка ИП на 2022 года.		Факт за 11 месяцев		Откл. %	Причины отклонения
			Кол-во	Сумма инвестиций	Кол-во	Сумма инвестиций	Кол-во	Сумма инвестиций		
	ВСЕГО на 2022 год		7 073	647 433	11 033	647 433		524 199	-19%	
1	Раздел 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей	м.	7 073	592 194	11 033	526 631	11 052	404 365	-23%	Строительно-монтажные работы по замене сетей находяся на стадии завершения. Ведутся работы по оформлению документации. Фактические данные за текущий год будут сформированы в январе месяце года, следующего за отчетным
2	Раздел 2. Погашение основного долга	тыс. тг		54 547		54 547		54 547	0%	
3	Раздел 3. Приобретение основных средств	шт	1	692	2	50 547	2	50 547	0%	приобретено оборудование для проведения работ методом ГНБ - буровая установка; приобретен насос Д-2500 на СВиО
4	Раздел 4. Модернизация Водоочистных сооружений	раб.			1	15 708	1	14 740	-6%	Окончание работ до 31 декабря

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Саранская

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Мустафина до ул.Разина

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ермекова (от Б.Жырау до Н.Абдирова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ермакова (от Б.Жырау до Н.Абдирова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года




Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубеева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаява (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года

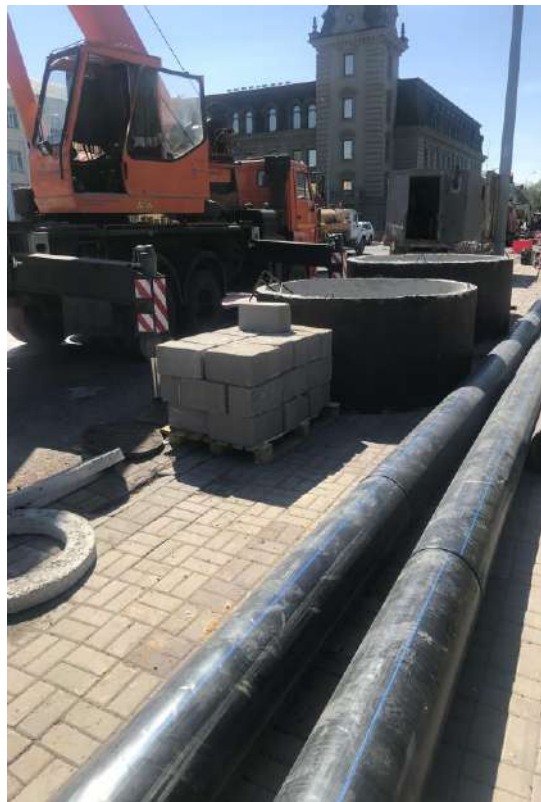

Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года




Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 4 квартала 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед.изм	Утвержденная ИП 2022 года (приказ № 163-ОД от 27.10.20 г.) на 2022 г.		Корректировка ИП на 2022 год.		Факт за 11 месяцев		Откл. %	Причины отклонения
			Кол-во	Сумма инвестиций	Кол-во	Сумма инвестиций	Кол-во	Сумма инвестиций		
	ВСЕГО на 2022 год		2 866	425 227	2335	425 227		316 701	-26%	
1	Раздел 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей	м.	2 866	310 296	2335	252 283	2269	143 885	-43%	Строительно-монтажные работы по замене сетей находяся на стадии завершения. Ведутся работы по оформлению документации. Фактические данные за текущий год будут сформированы в январе месяце года, следующего за отчетным
2	Раздел 2. ЭМЦ водоотведения	раб.	1	25 707	1	27 705	1	27 577	-0,5%	работы завершены
3	Раздел 3. Погашение основного долга Приобретение основных средств	тыс. тг		89 223		89 223		89 223	0%	по факту
4	Раздел 4. Реконструкция станции Аэрации	шт			1	48 000	1	48 000		замена задвижки ДУ-1400
5	Раздел 5. Приобретение основных средств	шт			20	8 016	20	8 016		Приобретено оборудование для замены сетей

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 4 квартала 2022 года

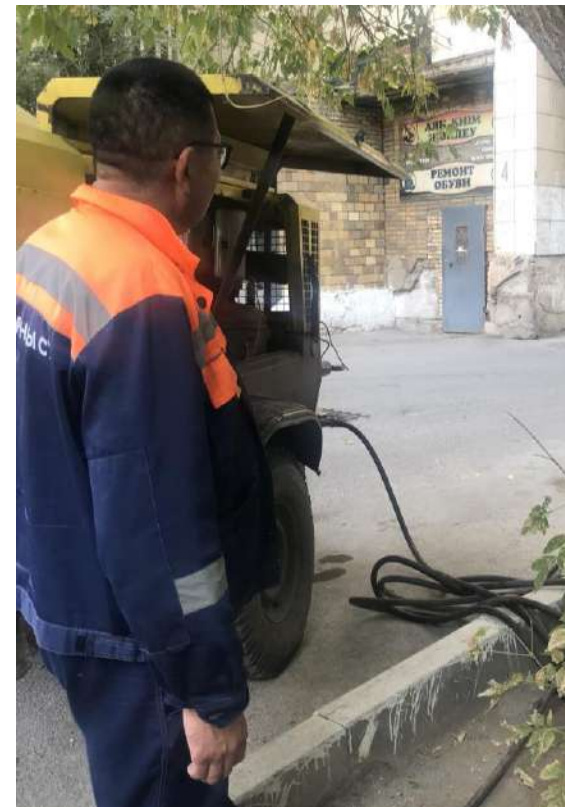


Капитальный ремонт канализационных сетей по проспекту Республики, 4

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по проспекту Республики, 4

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 4 квартала 2022 года

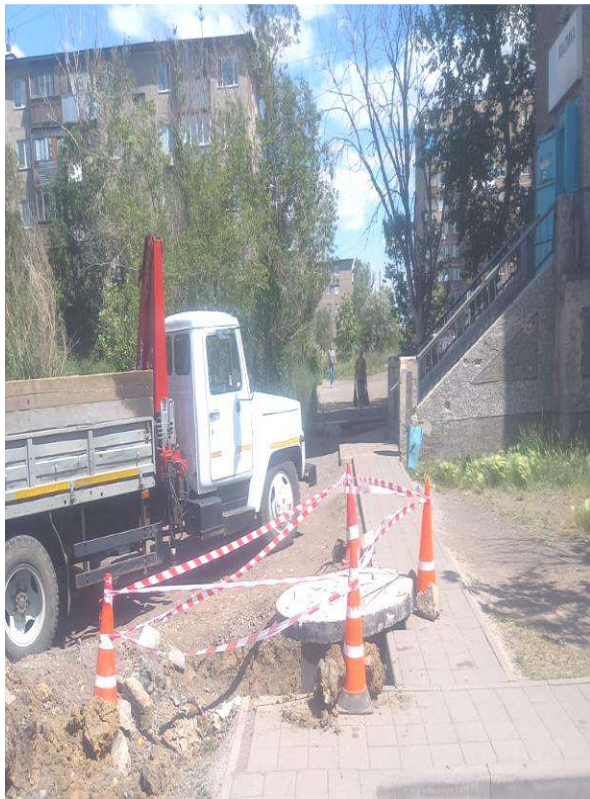


Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 15 мкр. д. 22-30

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 15 мкр. д. 22-30

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года

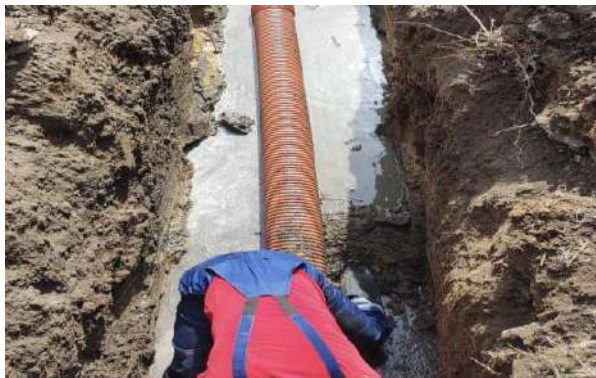

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 16 мкр. д. 25

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 16 мкр. д. 25

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года




Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года

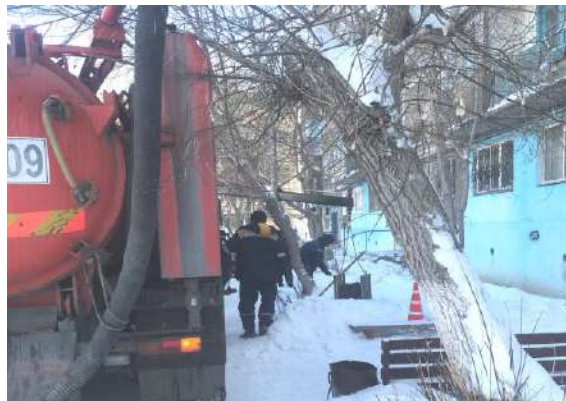

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 5

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 24

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 24

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных сетей Сортировка ВОДЧ-7 КНС-2 (711 км) (подряд)

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных коллектора по ул.Новонижняя

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартала 2022 года



Капитальный ремонт канализационных коллектора по ул.Новонижняя

Показатели эффективности по услуге водоснабжения

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (4 квартала), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (4 квартала)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,0%	22%	4,0%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	63,0%	62,0%	62,0%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	13,3%	13,5%	13,3%	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	999	1 360	1366	согласно плана	-

Показатели эффективности по услуге водоотведения

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (4 квартала), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (4 квартала)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3%	12%	3%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	85%	84,5%	84,5%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	13 923	20 820	17 489	Рост связан с передачей сетей в доверительное управление Товариществу	-

Спасибо за внимание!



ҚАРАҒАНДЫ СУ
