



**ТОО Қарағанды Су**

# **Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы**

**За 9 месяцев 2025 года**



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 9 месяцев 2025 года, тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм.	Утвержденная инвестиционная программа							Причины отклонения	
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			Источник инвестиций тыс. тенге без НДС				
				План	Факт за 9 месяцев	Отклонение	собственные	заемные	за счет иной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ВСЕГО на 2025 год</b>			<b>2 681 887</b>	<b>704 823</b>	<b>-1 977 065</b>	<b>2 681 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки Модернизация водоочистных сооружений	раб	4	469 412	60 060	-409 352	469 412			Замена запорной арматуры на БОС 1 оч.: - задвижки чуг. д-1000 мм с эл/прив - 2 шт.; - гидрозатворы д-600 мм с эл/прив - 2 шт.; - гидрозатворы д-400 мм с эл/прив - 6 шт.	Водопровод Ул.40 лет ВЛКСМ от д.1 до д. 43; Водопровод внутри м-на 4 Н. Город, Ержанова, по ул.Интернационалистов, по ул.Связи (ул.В.Интернационалистов (от ул. Алыханова до ул. Ермакова); Водопровод от скв. 115 до н/ст 5 узел (Водопровод по ул. Балхашская 1- 75); Водопровод по ул.
2	Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей	м	29 691	1 529 211	644 762	-884 449	1 529 211			Реконструкция участков водопроводных сетей в разных районах города Караганды.	Кривокуза(водопровод по ул. Аманжолова, 29/2-189); Водопровод по ул. Ишимской (ул. Ишимская, 1-50); Водопровод по ул. Ильича (Ильича 23-147).
3	Раздел 3. ЭМС водоснабжения Реконструкция н/станции "2 Зона"	раб	1	555 098	0	-555 098	555 098			Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2025 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов, основных средств. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.	
4	Раздел 4. СГЭ. Приобретение дизельной электростанции на водопроводные н/станции	шт	3	73 619	0	-73 619	73 619				
5	Раздел 5. Погашение основного долга			54 547	0	-54 547	54 547			Погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053"Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".	Срок погашения-декабрь 2025 года.



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 9 месяцев 2025 года



Реконструкция водопровода Ул.40 лет ВЛКСМ




# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Реконструкция водопровода от скв. 115 до н/ст 5 узел (Водопровод по ул. Балхашская)



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года

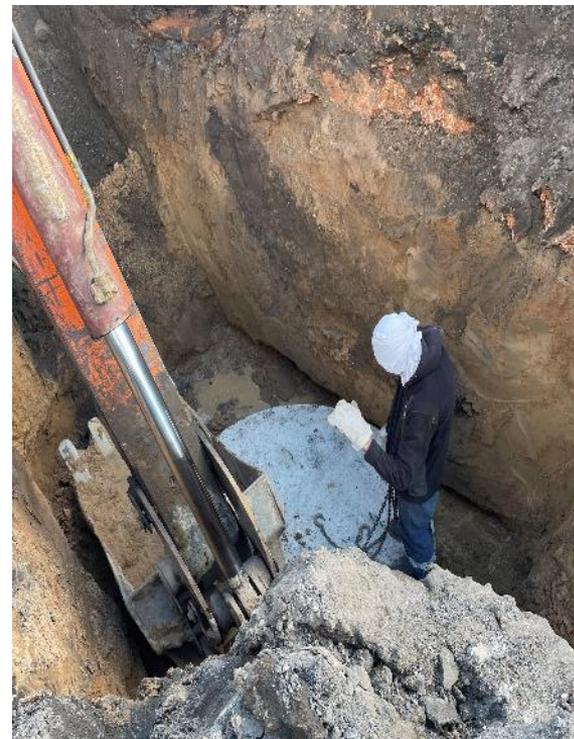

Реконструкция водопровода внутри м-на 4 Н. Город, Ержанова, по ул.Интернационалистов, по ул.Связи (ул.В.Интернационалистов (от ул. Алиханова до ул. Ермакова)



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Капитальный ремонт водопровода по ул. Ильича



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Реконструкция водопровода по ул. Крылова



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Капитальный ремонт водопровода по ул. Пахотная, Карабасская до КОС



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Капитальный ремонт водопровода по ул. Хабаровской





# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 9 месяцев 2025 года, тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Утвержденная инвестиционная программа								Причины отклонения	
		Ед-на изм	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			Источник инвестиций тыс. тенге без НДС				
				План	Факт за 9 месяцев	Отклонение	собственные	заемные	за счет иной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ВСЕГО на 2025 год</b>			<b>3 576 725</b>	<b>538 161</b>	<b>-3 038 565</b>	<b>3 576 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	<b>Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей</b>	<b>м</b>	<b>19 897</b>	<b>2 802 063</b>	<b>538 161</b>	<b>-2 263 902</b>	<b>2 802 063</b>			<i>Реконструкция участков канализационных сетей в разных районах города Караганды.</i>	<i>Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2025 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы, заключены договоры на СМР, авторский и технический надзор. Проведена реконструкция сетей канализации от д.1-1а, 3-3а, 2-2а ул.Стаделийная; по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (мкр.23 д.16-19); по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул. Металлистов д.26/4); главный коллектор по ул.Магнитогорская; канализационная линия к дому 48-49 пр.Н.Абдирова 25; канализация от жилых домов по ул.Штурманской; канализация к д.20-21, 21а, 24, 25, 46, 29_мкр.23 Пришахт-к (23 мкр. д.27-46); реконструкция коллектора от 50 кв Н.Города до гл. коллектора (пр.Б.Жырау 33, 35, ул.В.Интернационалистов 22а).</i>
2	<b>Раздел 2. Погашение основного долга , в т.ч.</b>	<b>тыс. тг.</b>		<b>320 644</b>	<b>0</b>	<b>-320 644</b>	<b>320 644</b>				
2.1	Дополнительное соглашение № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".			89 223	0	-89 223	89 223			<i>Погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".</i>	Срок погашения -декабрь 2025 года
2.2	Дополнительное соглашение № 04/01от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".			231 421	0	-231 421	231 421			<i>Погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 04/01от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".</i>	Срок погашения -декабрь 2025 года
3	<b>Раздел 3.Энерго-механическая служба</b>	<b>раб</b>	<b>1</b>	<b>454 018</b>	<b>0</b>	<b>-454 018</b>	<b>454 018</b>			<i>Заключен договор №04-10/39 с ТОО "Digital Trend"</i>	



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года

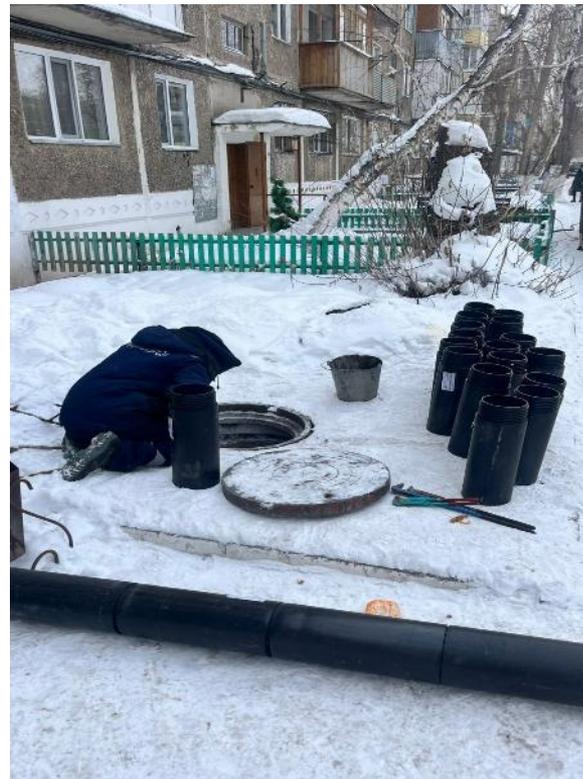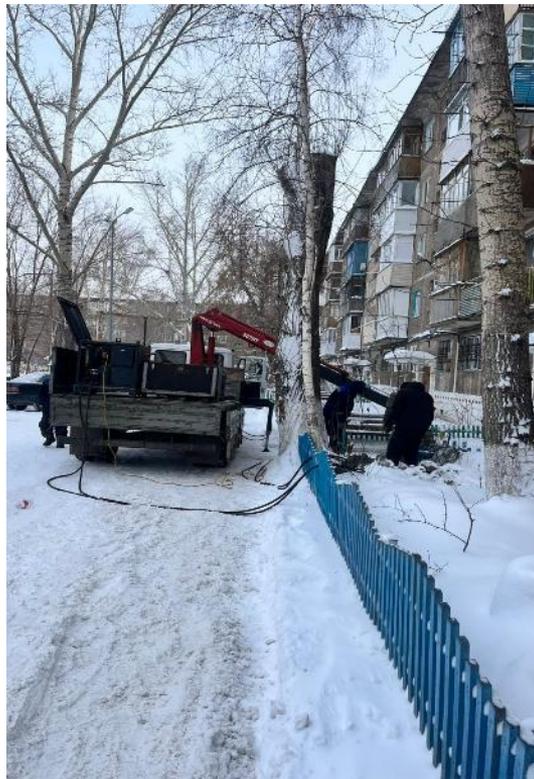

Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. 23 д. 16-19



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр.23 Пришахтинск д.27-46




## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Металлистов д.26/4



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года

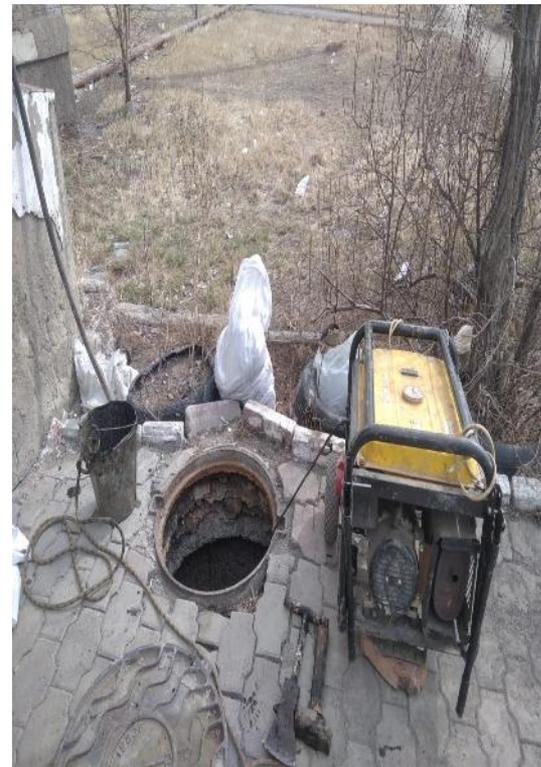

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Сталелитейная



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Капитальный ремонт главного коллектора по ул. Магнитогорская



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Капитальный ремонт канализационной линии по пр. Н.Абдирова 25



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Реконструкция Коллектора от 50кв Н.Города до главного коллектора (пр.Б.Жырау 33,35, ул.В. Интернационалистов 22а)




# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Гапеева



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года

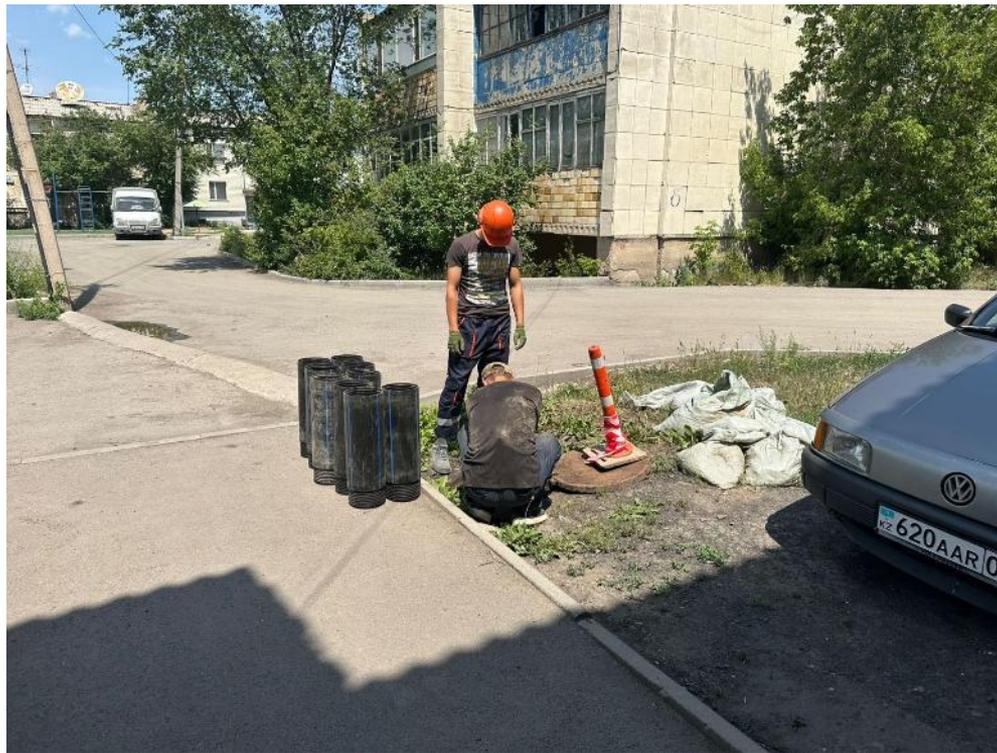

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Мирная



**Благодарим за  
внимание!**

*[www.kar-su.kz](http://www.kar-su.kz)*

