



ТОО Қарағанды Су

**Отчет об исполнении
утвержденных тарифных смет,
утвержденных инвестиционных программ,
о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг,
о достижении показателей эффективности
по регулируемым услугам
водоснабжения и водоотведения**

за 2024 год

23 апреля 2025 года



Характеристика предприятия



Основано в 1958 году

Форма собственности:

100% - ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды»


Наименование	Ед. изм.	Водо-снабжение	Водо-отведение
Производительность комплексов водоподготовки и приемки стоков (проектная / фактическая)	тыс.м ³ /сутки	650 / 208	232 / 112
	%	32%	48%
Протяженность сетей, в т.ч.:	км	1 119	737
в доверительном управлении и оперативном обслуживании	км	174	79
Количество насосных станций, в т.ч.:	ед.	99	9
главные	ед.	9	
подкачивающие	ед.	90	
том числе в доверительном управлении и оперативном обслуживании	ед.	1	3
Воздушные и кабельные линии электропередач	км	77	
Подстанции	ед.	15	
Численность персонала	чел.	1 614	



Виды деятельности



Основные регулируемые виды деятельности



**Услуги
водоснабжения**



**Услуги
водоотведения**

Иные виды деятельности не осуществляются



Тарифы на услуги водоснабжения тенге за 1 м³


Гос. программа «Тариф в обмен на инвестиции» с 01.07.2023 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	Приказ № 180-ОД		Приказ № 67-ОД от 26.06.2023 г.		% роста	Приказ № 67-ОД от 26.06.2023 г.		% роста
		с 01.01.2023 г.		с 01.07.2023 г.			с 01.01.2024 г.		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС		без НДС	с НДС	
1	Подача воды по магистральным трубопроводам								
1.1.	Дачи (техническая вода)	30,64	34,32	35,85	40,15	17%	39,66	44,42	11%
1.2.	ТОО "Окжетпес-Т"	93,54	104,76	109,44	122,57	17%	126,30	141,46	15%
1.3.	ТОО «Караганда Энергоцентр»	120,02	134,42	140,42	157,27	17%	162,07	181,52	15%
1.4.	ТОО «Теплотранзит Караганда»	146,82	164,44	171,78	192,39	17%	198,26	222,05	15%
2	Подача воды по распределительным сетям								
2.1.	Физические лица (население)	103,49	115,91	120,72	135,21	17%	133,98	150,06	11%
2.2.	Бюджетные организации	825,25	924,28	965,54	1 081,40	17%	1 114,36	1 248,08	15%
2.3.	Предприятия малого бизнеса до 5000 м³ в год	363,84	407,50	425,69	476,77	17%	491,31	550,27	15%
2.4.	Предприятия среднего и крупного бизнеса свыше 5000 м³ в год	804,22	900,73	940,94	1 053,85	17%	1 085,96	1 216,28	15%
Средний тариф		158,47		184,86		17%	212,15		15%

Тарифы на услуги водоотведения тенге за 1 м³

Гос. программа «Тариф в обмен на инвестиции» с 01.07.2023 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	Приказ № 180-ОД		Приказ № 67-ОД от 26.06.2023 г.		% роста	Приказ № 67-ОД от 26.06.2023 г.		% роста
		с 01.01.2023 г.		с 01.07.2023 г.			с 01.01.2024 г.		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС		без НДС	с НДС	
1	Население	94,54	105,88	156,24	174,99	65%	190,18	213,00	22%
2	Бюджетные организации	425,59	476,66	703,36	787,76	65%	898,86	1 006,72	28%
3	Прочие потребители	398,32	446,12	658,29	737,28	65%	841,27	942,22	28%
Средний тариф		182,84		302,18		65%	379,44		26%

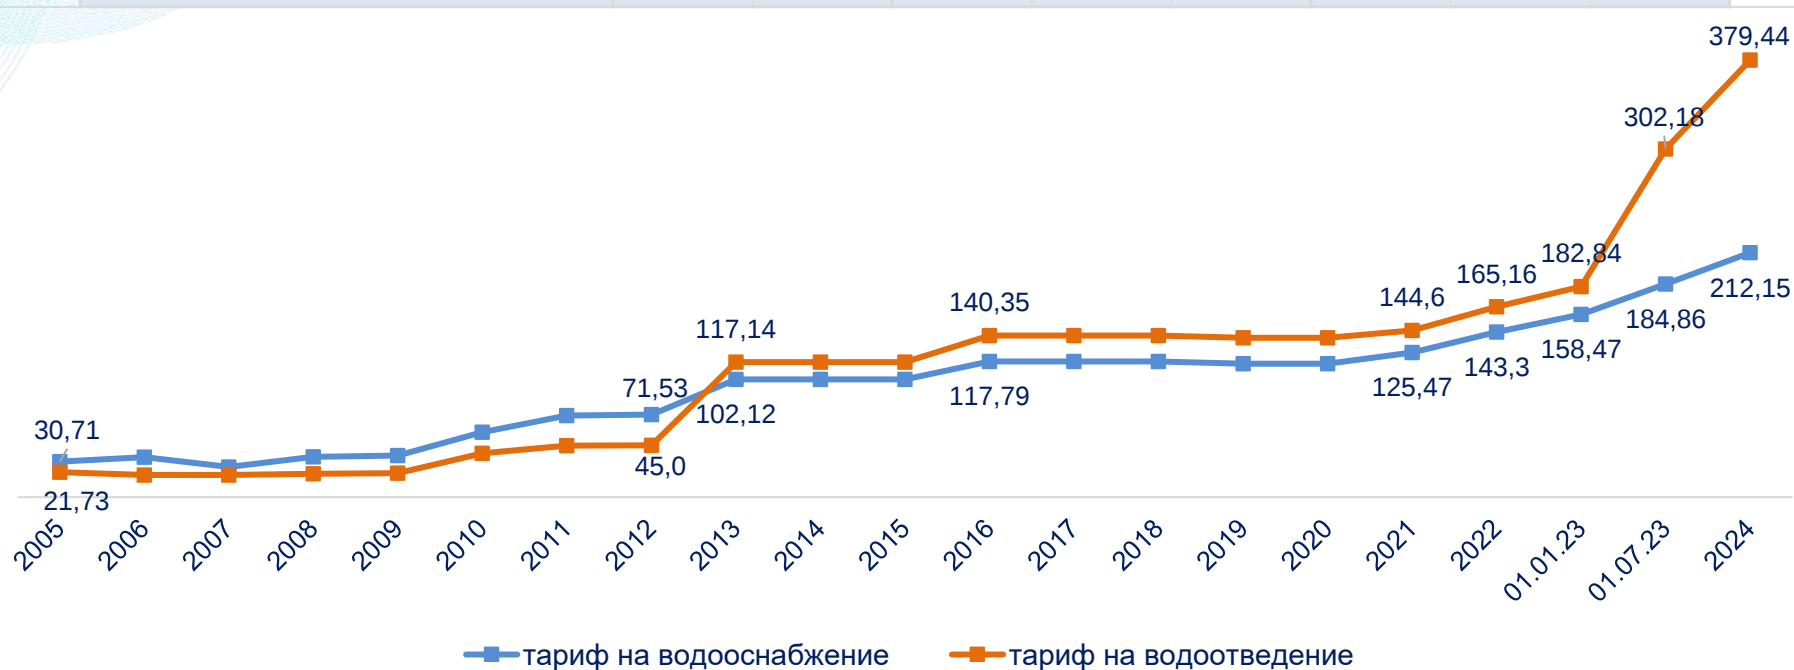



Динамика объемов регулируемых услуг, млн. м³

ПОКАЗАТЕЛИ	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Откл. 2024 / 2023
Услуги водоснабжения							
ТОО «Караганда Энергоцентр»	16,1	16,8	20,6	17,6	17,6	17,9	0,3
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4,2	4,4	3,8	3,2	3,1	3,1	0
ТОО «Окжетпес-Т»	5	5,1	4,4	4,4	4,7	4,5	-0,2 ↓
Дачи	0,1	0,2	0,5	0,5	0,4	0,2	-0,2
Бюджет	1,3	1	1,1	1	1	1,1	0,1
Промышленность	2,4	2,3	3	3,5	3,6	3,4	-0,2 ↓
Население	14,4	15,2	16,1	16,4	17,5	17,1	-0,4 ↓
Итого услуги водоснабжения	43,5	45,1	49,4	46,7	48,0	47,3	-0,7
% снижения / увеличения		3,7%	9,5%	-5,5%	2,8%	-1,4%	
Услуги водоотведения							
Юридические лица	5,9	5,3	4,2	4,7	4,5	4,4	-0,1 ↓
Бюджет			1,3	1,4	1,3	1,4	0,1
Население	15,1	15,8	16	16,3	17,3	17,1	-0,2 ↓
Итого услуги водоотведения	21,0	21,1	21,5	22,4	23,2	22,9	-0,3
% снижения / увеличения		0,5%	1,9%	4,2%	3,6%	-1,3%	



Анализ исполнения регулируемых услуг за 2024 год, млн. м³

ПОКАЗАТЕЛИ	Утверждено в тарифной смете	Фактические показатели	Отклонение факт/план	
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
ТОО «Караганда Энергоцентр»	16,1	17,9	1,8	11% ↑
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4,2	3,1	-1,1	-26% ↓
ТОО «Окжетпес-Т»	5,0	4,5	-0,5	-11%
Дачи	0,13	0,20	0,07	51%
Бюджет	1,3	1,1	-0,2	-15% ↓
Промышленность	2,4	3,4	1,1	45% ↑
Население	13,8	17,1	3,3	24% ↑
Итого услуги водоснабжения	42,9	47,3	4,4	10%
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ				
Население	15,1	17,1	2,0	13% ↑
Бюджет	1,6	1,4	-0,2	-12%
Юридические лица	4,4	4,4	0,0	0%
Итого услуги водоотведения	21,1	22,9	1,8	9%



Основные финансово-экономические показатели, млн. тенге

ПОКАЗАТЕЛИ	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Откл. %
							2024 / 2023
Основная деятельность							
Доходы	7 788	7 821	9 005	10 967	14 884	18 860	27%
Затраты на производство	6 572	7 158	7 681	9 513	11 625	14 196	22%
Расходы периода	682	652	736	1 115	2 397	1 576	-34%
Финансовые расходы	1,1	1,2	1,4	18,9	34	24	-29%
Результат деятельности	533	9	587	320	828	3 064	270%
Инвестиции, в том числе:	2 004	5 248	1 444	1 798	6 105	6 164	1%
<i>собственные средства в тарифе</i>	2 004	949	493	1 082	4 151	6 040	46%
<i>заемные средства по программе Нурлы Жер</i>	0	1 037	936	589	1 954	124	



Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 2024 год, млн. тенге

№	Наименование показателей тарифной сметы	Утверждено в тарифной смете	Фактические показатели	Откл., %	Причины отклонений
1	Материальные затраты, в т.ч.:	2 629	3 370	28%	
1.1	материалы на очистку воды	335	385	15%	Увеличение объема оказанных услуг и цен реагентов
1.2	запчасти на автотранспорт и спец. технику	12	14	19%	Рост цен на шины и аккумуляторы
1.3	ГСМ	158	186	17%	Рост цен
1.4	топливо	1,5	1,5	4%	Рост цен
1.5	электроэнергия покупная	1 175	1 636	39%	Увеличение объема оказанных услуг и тарифа на электроэнергию
1.6	покупная вода	948	1 148	21%	Увеличение объема оказанных услуг и тарифа на покупную воду канала им.К.Сатпаева
2	Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями	3 183	4 169	31%	Увеличение заработной платы производственного персонала
3	Амортизация	741	810	9%	Увеличение капитальных вложений в модернизацию
4	Ремонт	253	376	48%	Увеличение ремонтных работ
5	Прочие затраты	330	430	30%	Рост тарифа на теплоэнергию
6	Общие и административные расходы	235	270	15%	Увеличение заработной платы административного персонала
7	Расходы на содержание службы сбыта	133	142	7%	Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию
8	Расходы на выплату вознаграждений	0,1	0,6	336%	Доп.выплаты по договорам Нурлы Жер, договору финансового лизинга
9	Всего затрат	7 504	9 566	27%	Рост расходов на зарплату, ремонты, электро- и теплоэнергию
10	Прибыль	1 607	742	-54%	По причине роста расходов по статьям
11	Всего доходов	9 111	10 309	13%	В связи с ростом объема услуг
12	Объемы оказанных услуг	42,9	47,4	10%	Увеличение по населению, КЭЦ и пром. предприятиям




Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 2024 год, млн. тенге

№	Наименование показателей тарифной сметы	Утверждено в тарифной смете	Фактические показатели	Откл., %	Причины отклонений
1	Материальные затраты, в т.ч.:	988	905	-8%	
1.1	материалы на очистку сточных вод	78	30	-62%	Экономия в связи с применением более эффективных методов очистки
1.2	запчасти на автотранспорт и спец. технику	7	7	0%	
1.3	ГСМ	82	89	8%	Рост цен
1.4	топливо	0,7	1,1	59%	Рост цен
1.5	электроэнергия покупная	819	779	-4,9%	Экономия в пределах 5%
2	Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями	2 131	2 823	32%	Увеличение заработной платы производственного персонала
3	Амортизация	578	612	6%	Увеличение капитальных вложений в модернизацию
4	Ремонт	108	198	83%	Увеличение ремонтных работ
5	Прочие затраты	471	476	1%	Рост тарифа на теплоэнергию
6	Общие и административные расходы	411	443	8%	Увеличение заработной платы административного персонала
7	Расходы на содержание службы сбыта	133	142	7%	Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию
8	Расходы на выплату вознаграждений	0,9	0,9	0%	
9	Всего затрат	4 821	5 601	16%	Рост расходов на зарплату
10	Прибыль	3 168	2 580	-19%	По причине роста расходов по заработной плате
11	Всего доходов	7 989	8 181	2%	В связи с ростом объема услуг
12	Объемы оказанных услуг	21,1	22,9	9%	



Динамика текущих ремонтов и инвестиций млн. тенге без НДС

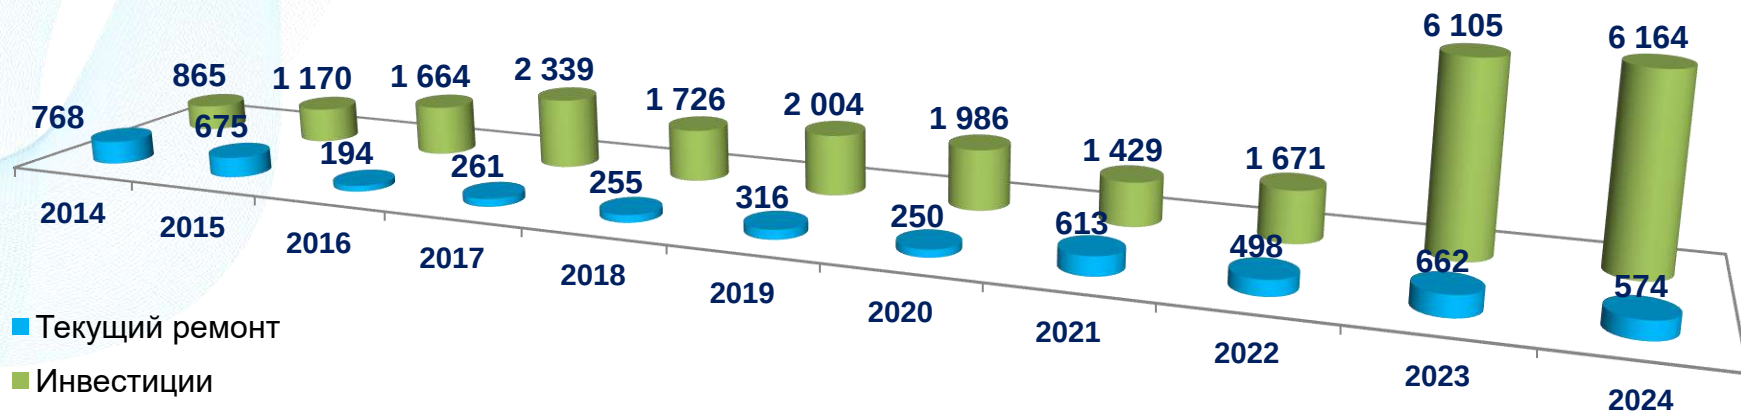

Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего за 11 лет
Текущий ремонт	768	675	194	261	255	316	250	613	498	662	574	5 066
Инвестиции	865	1 170	1 664	2 339	1 726	2 004	1 986	1 429	1 671	6 105	6 164	27 123
в том числе:												0
собственные средства	865	889	945	2 339	1 726	2 004	949	493	1 082	4 151	6 040	21 483
заемные средства	-	281	719		-	0	1 037	936	589	1 954	124	5 639
Итого	1 633	1 845	1 858	2 600	1 981	2 320	2 236	2 042	2 169	6 767	6 737	32 189



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2024 год, млн. тенге

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Отклонение		Пояснение
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1.	Раздел 1. Служба водоснабжения и очистки			552		553		1	
1.1	Реконструкция Насосной станции №2	раб.	1	552	1	553	0	1	
2.	Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт сетей		24 558	1 787	24 631	1 389	73	-398	Экономия в результате конкурсных процедур; на проведение технического надзора; применение более эффективных методов и технологий.
2.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей 34 объекта	метр	24 558	1 787	24 631	1 389	73	-398	
	в том числе Мероприятия по нац. проекту "Тариф в обмен на инвестиции"	метр	10 570	778	10 603	551	33	-227	
3.	Раздел 3. Погашение основного долга	млн. тг.		55		55		0	
	Направления использования экономии					397			За счет экономии по исполнению ИП.
4.	Приобретение новых основных средств:	ед.			89	325			
4.1	- авто- и спец. техники	ед.			11	288			8 аварийно-ремонтных мастерских 2 автобуса ГАЗ, 1 погрузчик.
4.2	- оборудования	ед.			78	37			Насосы, аппараты для пайки труб, приборы для лаборатории, серверы, компьютеры, расходомеры, генератор, мебель
5.	Капитальный ремонт оборудования и сооружений	ед.			7	72			Кап. ремонт электродвигателя насоса на НС № 3, экскаватора ЕК-18, насосной станции 2 зона, системы видеонаблюдения, водопровода, теплофикации
ВСЕГО за 2024 год				2 393		2 393		0	



Реконструкция Насосной станции № 2. 1 этап



НС № 2 является стратегически важным водохозяйственным объектом, относится к первой категории.

Обеспечивает бесперебойную круглосуточную подачу воды всем потребителям. Введена в эксплуатацию в 1974 г.

На протяжении **50 лет эксплуатации** реконструкция и техническое перевооружение **не производились**.

Физический износ критический, составляет 80-100%.

В 2024 г. произведен ремонт фундамента, кровли, дверных проемов, окон, полов, ворот, внутренняя и наружная отделка, вентиляция, освещение, пожарная сигнализация.

В 2025 г. будет установлен частотный преобразователь для автоматизации технологического процесса и экономии электроэнергии.

Стоимость реконструкции 1 103 393 тыс. тенге, в том числе 1 этап в 2024 году - 538 515 тыс. тенге.



1. Реконструкция водопровода ул. Гражданская 12 – 55, D 160



Построен в 1950 году из стальных труб D 150 мм, L 932,2 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 12 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Гражданская

Протяженность реконструированного аварийного участка **932,2 м D 160, п/э**, методом ГНБ

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 39 941,3 тыс. тенге



2. Реконструкция водопровода ул. Крылова, 32 – 62, D 315



Построен в 1980 году из стальных труб D 300 мм, L 1054 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 13 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей Нового города.

Протяженность реконструированного аварийного участка **1054 м D 315, п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **10 000 человек**

Стоимость 141 625,3 тыс. тенге




За период 2019-2024 гг. на нем возникло и ликвидировано 12 аварий.

Протяженность реконструированного аварийного участка **836 м** D 160 п/э, методом ГНБ.

Стоимость 51 805,7тыс. тенге



4. Реконструкция водопровода по ул.Пичугина (ул.Комиссарова, от Новоселов до н/станции пр. Абдирова, 19) D 160

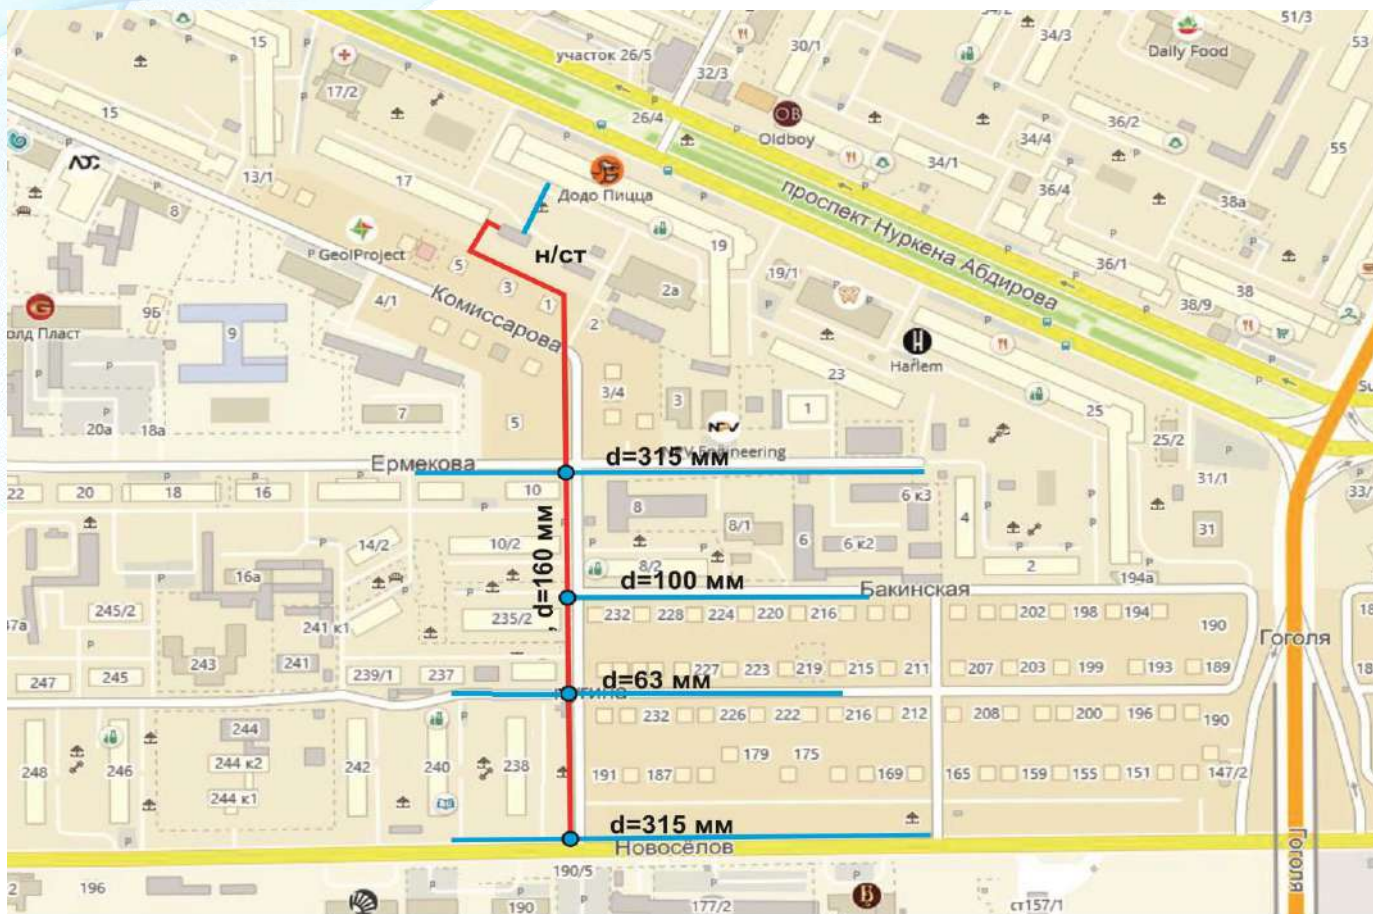

Построен в 1967 году из стальных труб D 150 мм, L 525 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 14 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Новоселов, ул.Пичугина, пр. Н.Абдирова.

Протяженность реконструированного аварийного участка **525 м D 160**, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 000 человек**

Стоимость 15 869,2 тыс. тенге

5. Водопроводные сети по Ленинскому району от УЖКХ (пр. Б.Жырау, д. 68-76) D 200



Построен в 1968 году из стальных труб D 200 мм, L 543,3 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 16 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей пр. Бухар-Жырау, ул. Комиссарова, ул. Можайского.

Протяженность реконструированного аварийного участка **543,3 м D 200, п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 000 человек**

Стоимость 19 184,6 тыс. тенге

6. Водопровод по ул. Ермакова, от Ботанической до Анжерской (ул. Ермакова, 98-116) D 200



Построен в 1989 году из чугунных труб D 300 мм, L 983 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 17 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей ул.Ермакова

Протяженность реконструированного аварийного участка **983 м D 200, п/з**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 000 человек**

Стоимость 67 330,3 тыс. тенге

7. Водопровод вокруг мкр. 30 (ул. Гапеева, от ул. Рыскулова до Гапеева, д. 19) D 315

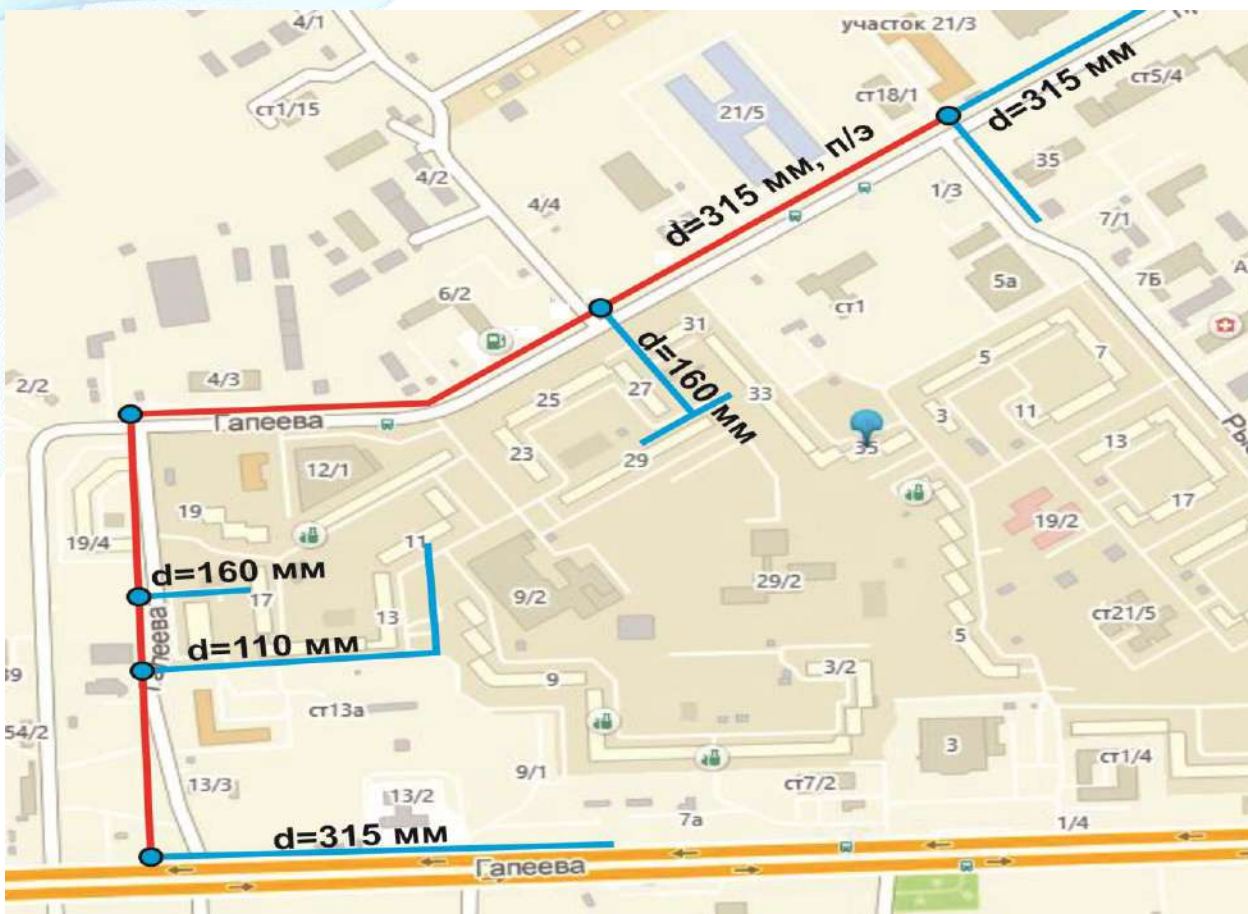

Построен в 1980 году из стальных труб D 300 мм, L 1 151,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 19 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей 30 мкр.

Протяженность реконструированного аварийного участка **1 151,5 м D 315, п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **3 000 человек**

Стоимость 38 764,2 тыс. тенге

8. Водопровод к н/ст и д. 9,10,11, 13,13,14,16,17 мкр. Орбита (мкр. Орбита-1, д.12 - 16) D 160

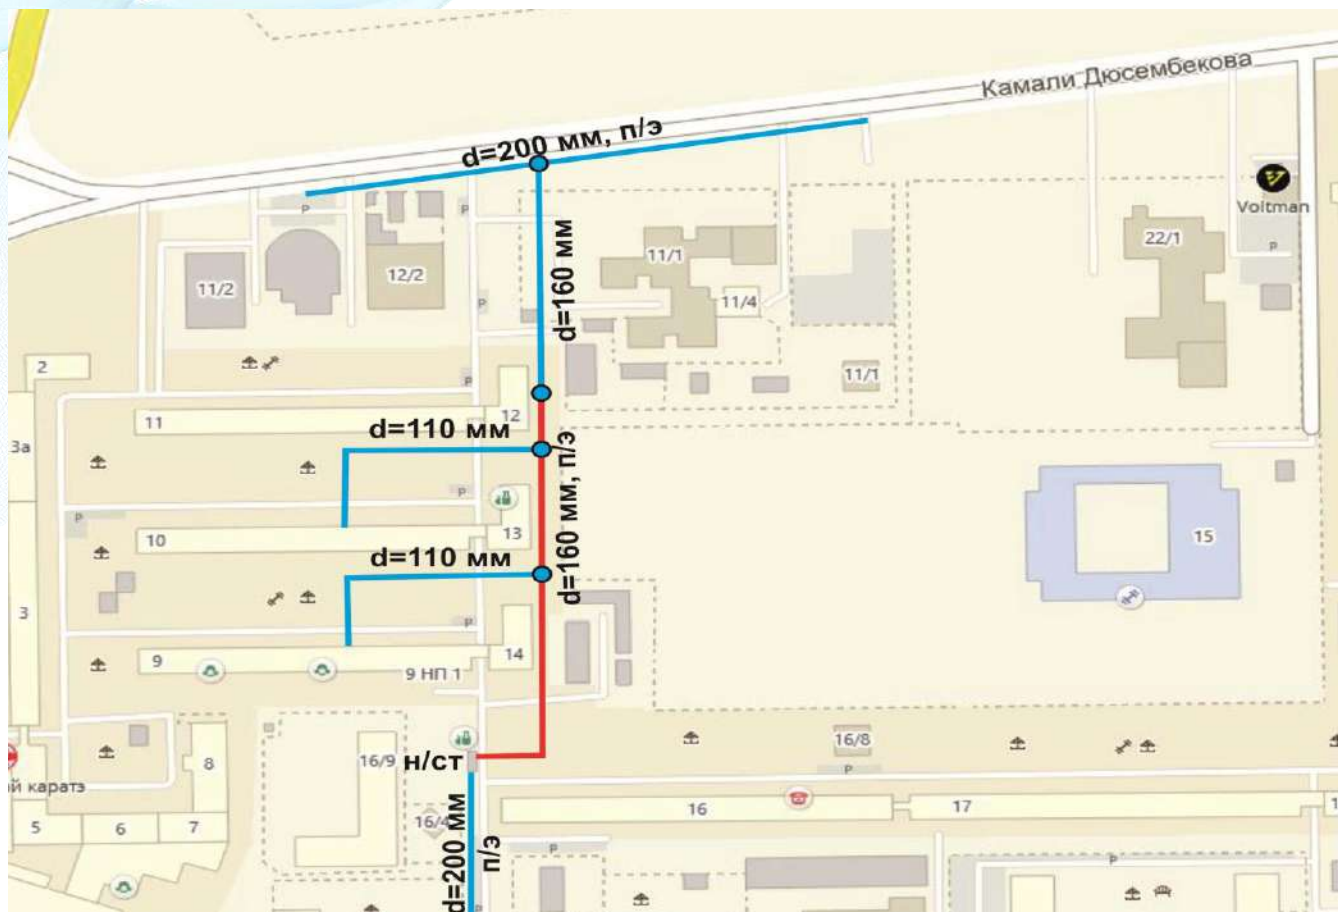

Построен в 1984 году из стальных труб D 150 мм, L 209,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 8 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей мкр. Орбита.

Протяженность реконструированного аварийного участка **209,5 м** D 160, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 7 807,7 тыс. тенге



9. Водопровод на мкр. Степной 4 от прох.кол-ра до В-20 через В 25, 24, 23, 22, 21 от прох.кол-ра до В 26,27,28,31,34 (мкр. Степной-4, д. 21-31) D 160



Построен в 1987 году из стальных труб D 150 мм, L 247 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 10 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей мкр. Степной 4, мкр. Степной 1.


Протяженность реконструированного аварийного участка **247 м** D 160, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 7 454,8 тыс. тенге



10. Водопровод к д. 6,7,8 (ул. Сатыбалдина, от пр. Шахтеров до коллектора) D 315

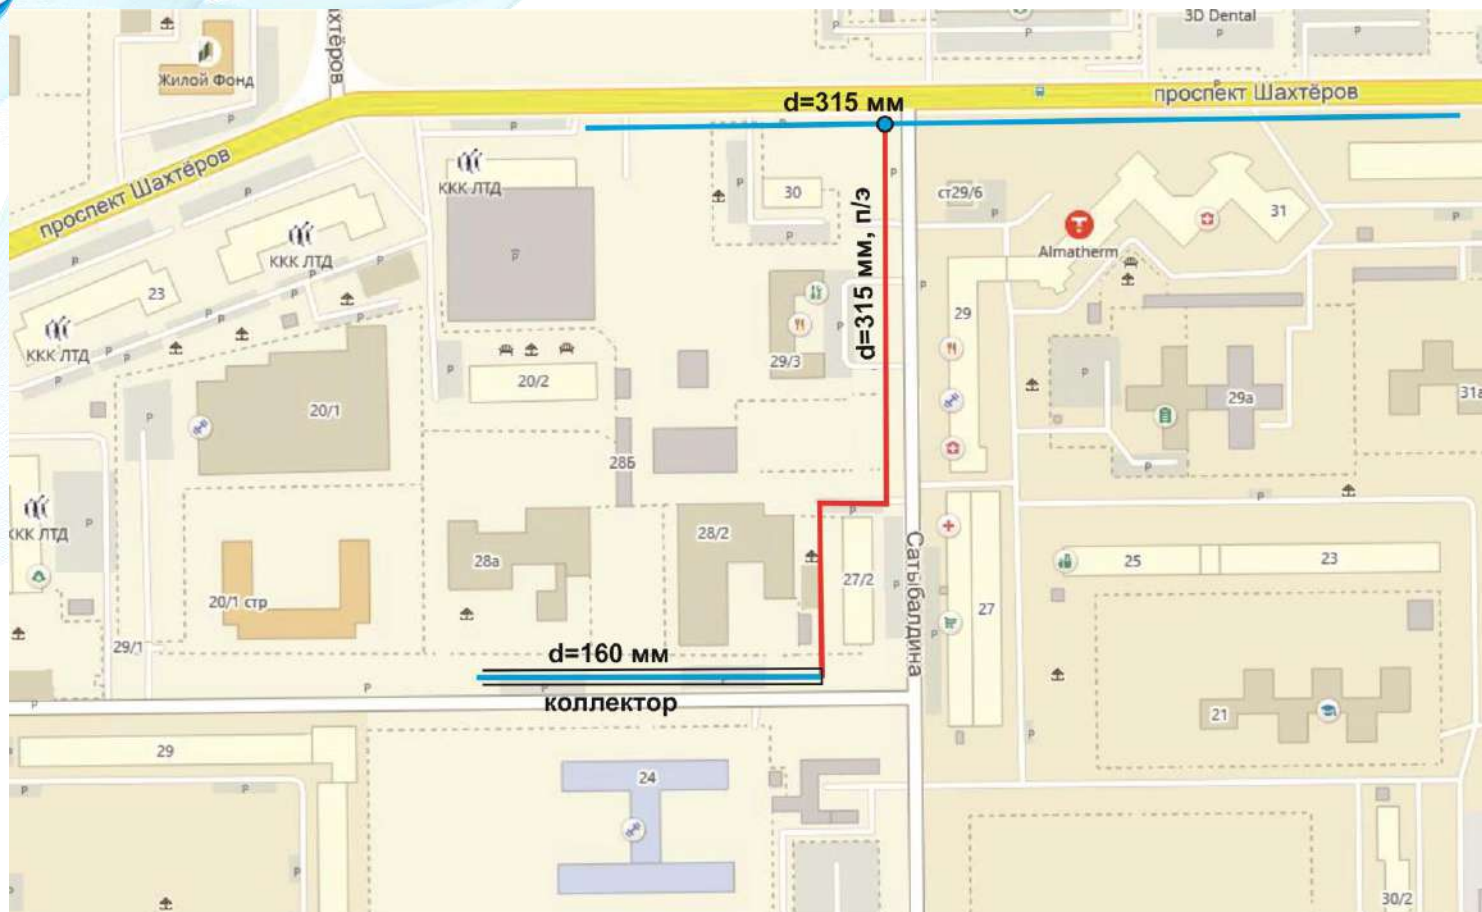

Построен в 1992 году из стальных труб D 300 мм, L 276 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 16 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Шахтеров, ул. Сатыбалдина, пр. Строителей.

Протяженность реконструированного аварийного участка **276 м D 315, п/э**, методом ГНБ..

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 10 956,7 тыс. тенге

11. Наружный водопровод к д. 6,7,8 мкр. Степной 4 (мкр. Степной, от ОШ №23, до мкр. Степной-2, д. 14/15) D 160

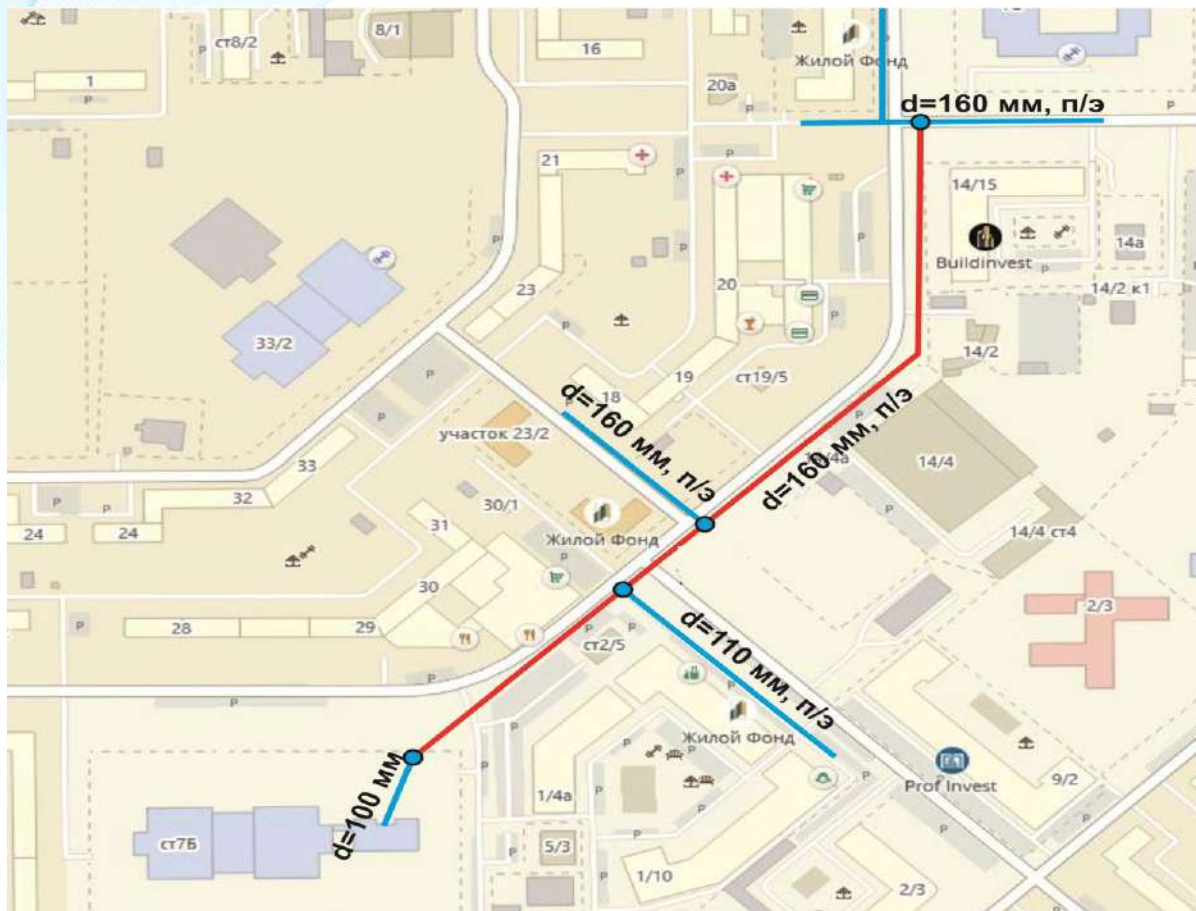

Построен в 1992 году из стальных труб D 150 мм, L 365 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 13 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей мкр. Степной 2, мкр. Степной 4..


Протяженность реконструированного аварийного участка **365 м D 160, п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 8 966,9 тыс. тенге



12. Реконструкция водопровода мкр.Степной-1 (ул.Муканова, от мкр.Степной-1, д.11а до Степной-4, д.11) D 315

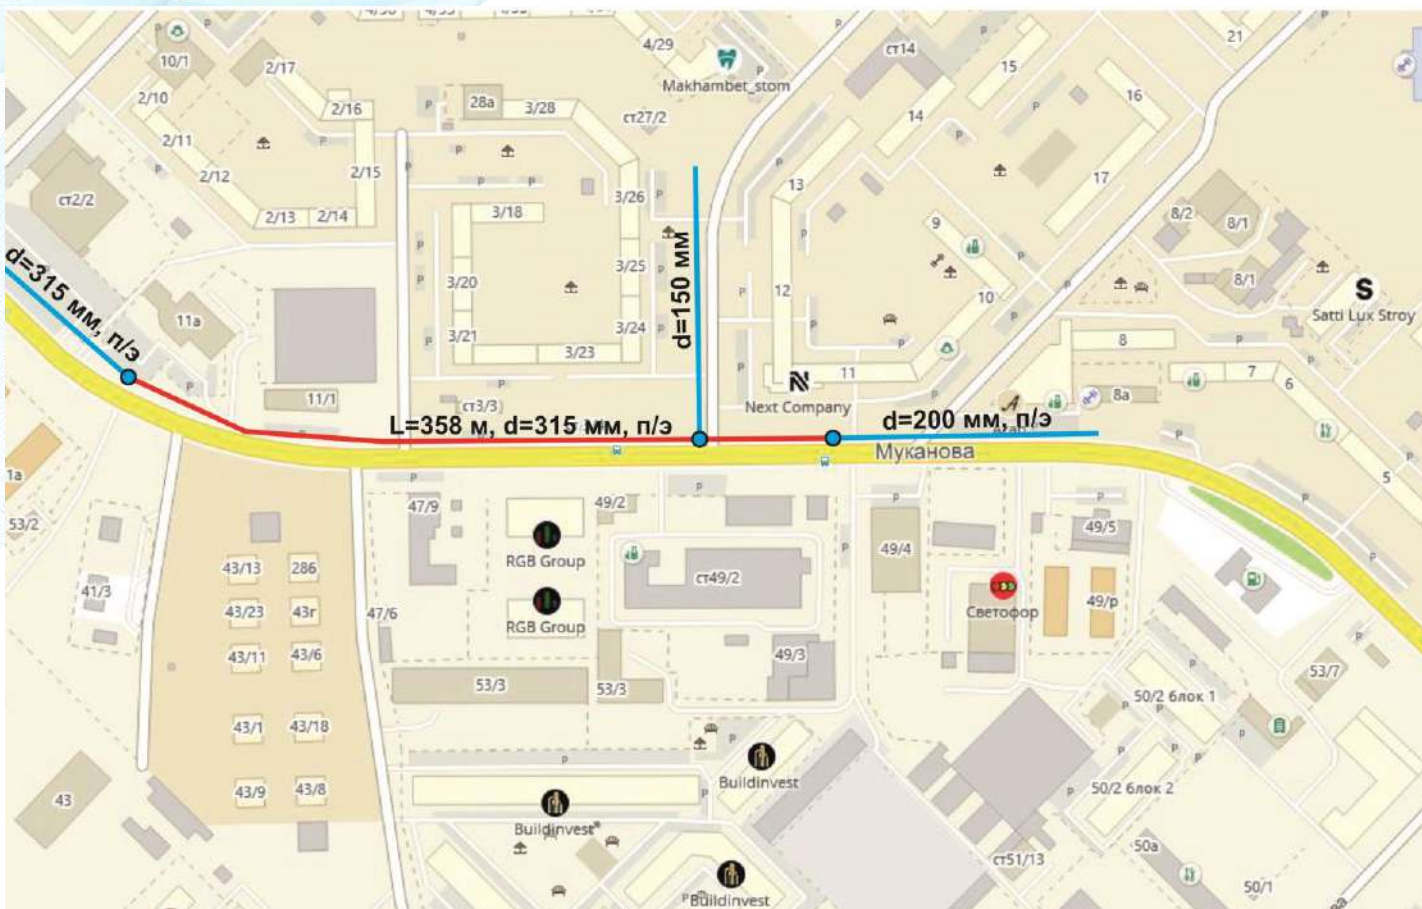

Построен в 1983 году из стальных труб D 300 мм, L 388,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 16 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей мкр. Степной 1,2,3,4.

Протяженность реконструированного аварийного участка **388,5 м D 315, п/э**, методом ГНБ

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 23 310,7 тыс. тенге

13. Реконструкция водопровода мкр. 23 Пришахтинска (23 мкр. д.27, 30, 31, 39) D 160

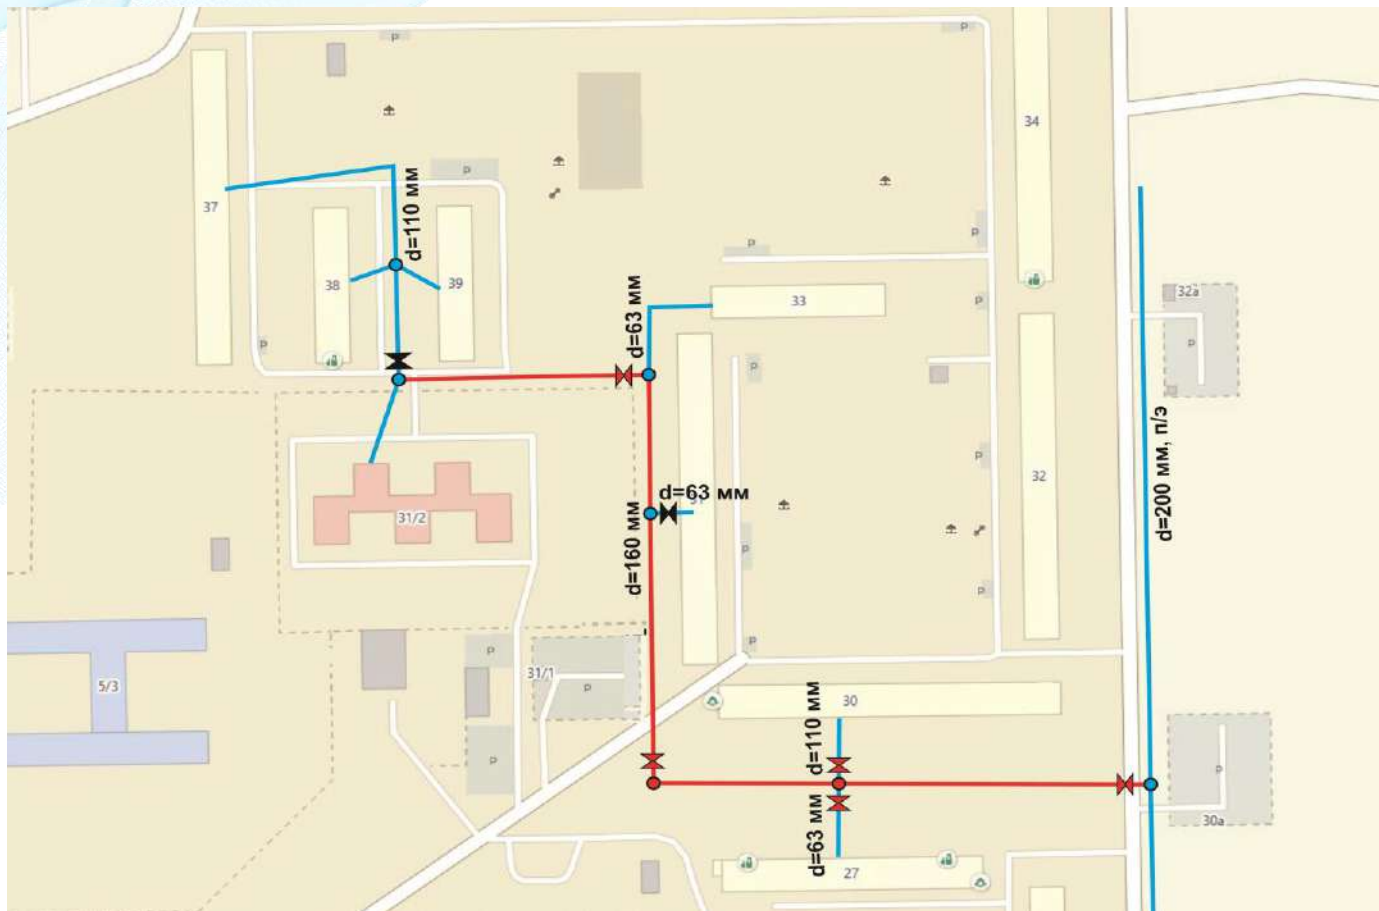

Построен в 1970 году из чугунных труб D 150 мм, L 409 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 13 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей многоэтажных жилых домов мкр. 23 д. 27, 30, 31, 39

Протяженность реконструированного аварийного участка **409 м** D 160, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 29 105, 6 тыс. тенге

14. Реконструкция водопровода «Кировский район от УЖКХ» (ул. Металлистов, 18а-34) D 110

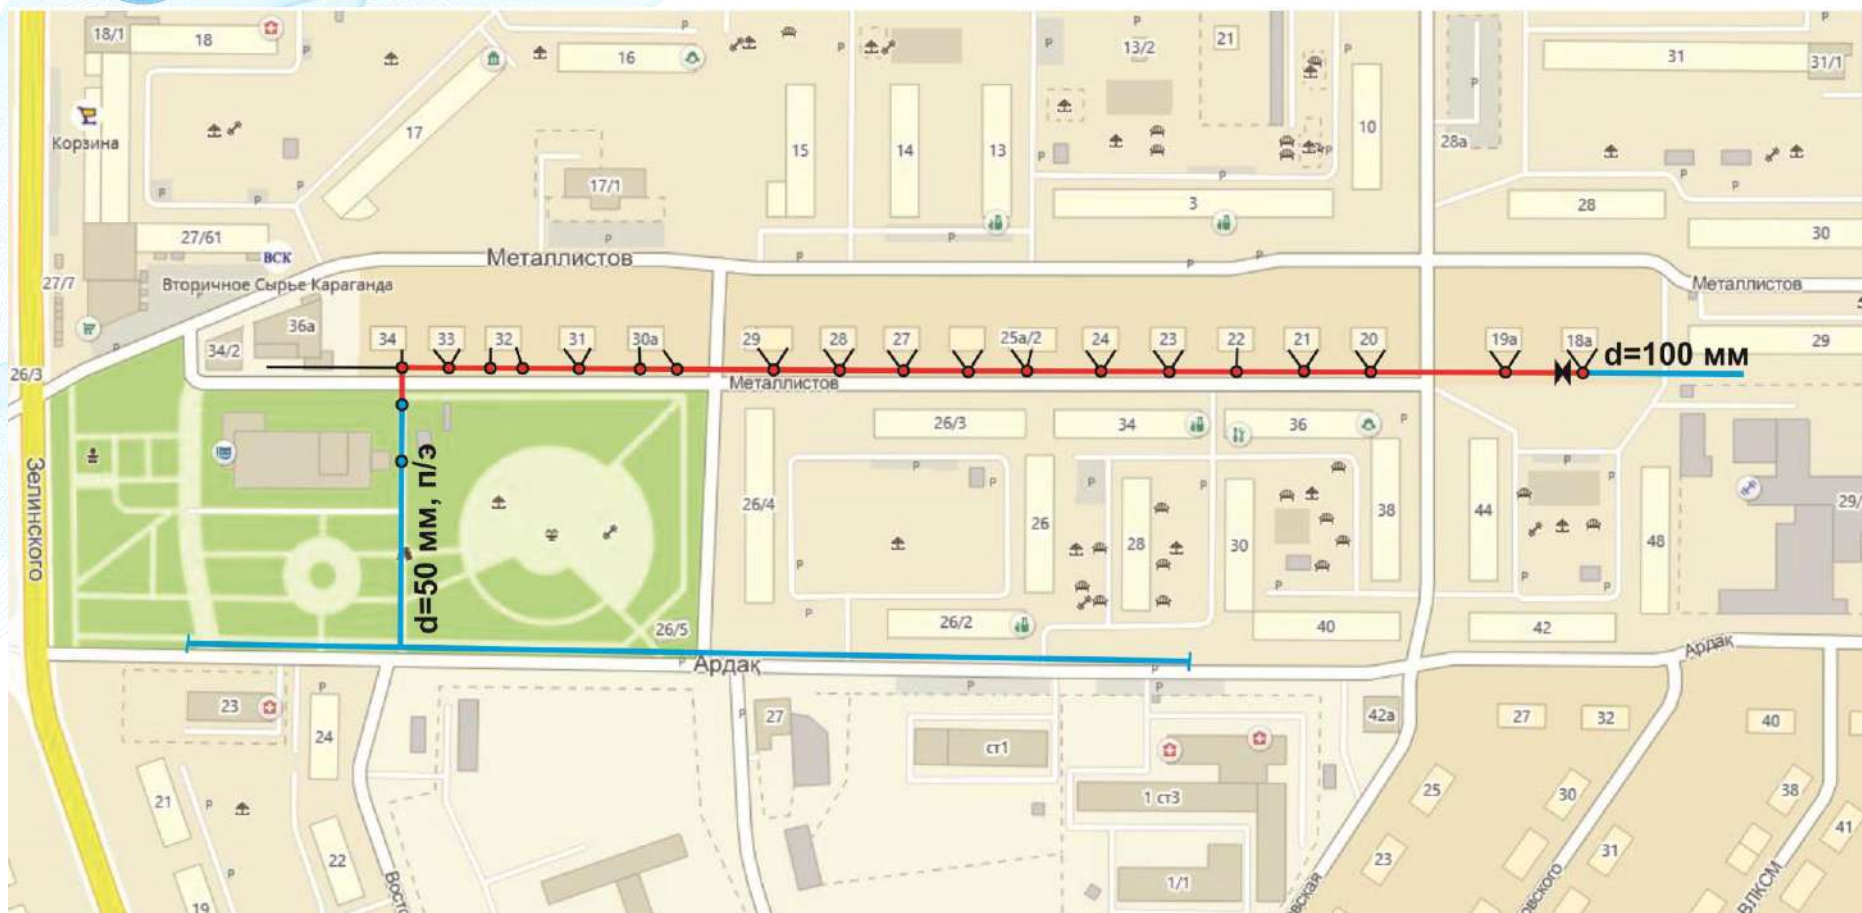

Построен в 1974 году из стальных труб D 100 мм, L 642,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 12 аварий.

Осуществляет водоснабжение жителей частного сектора ул. Металлистов, 18а - 34.


Протяженность реконструированного аварийного участка **642,5 м** D 110, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 30 540 тыс. тенге



15. Реконструкция водопровода Пришахтинск (22 мкр.д. 17/1-10; ул. Ардак от ДК до Металлистов, 42) D 315

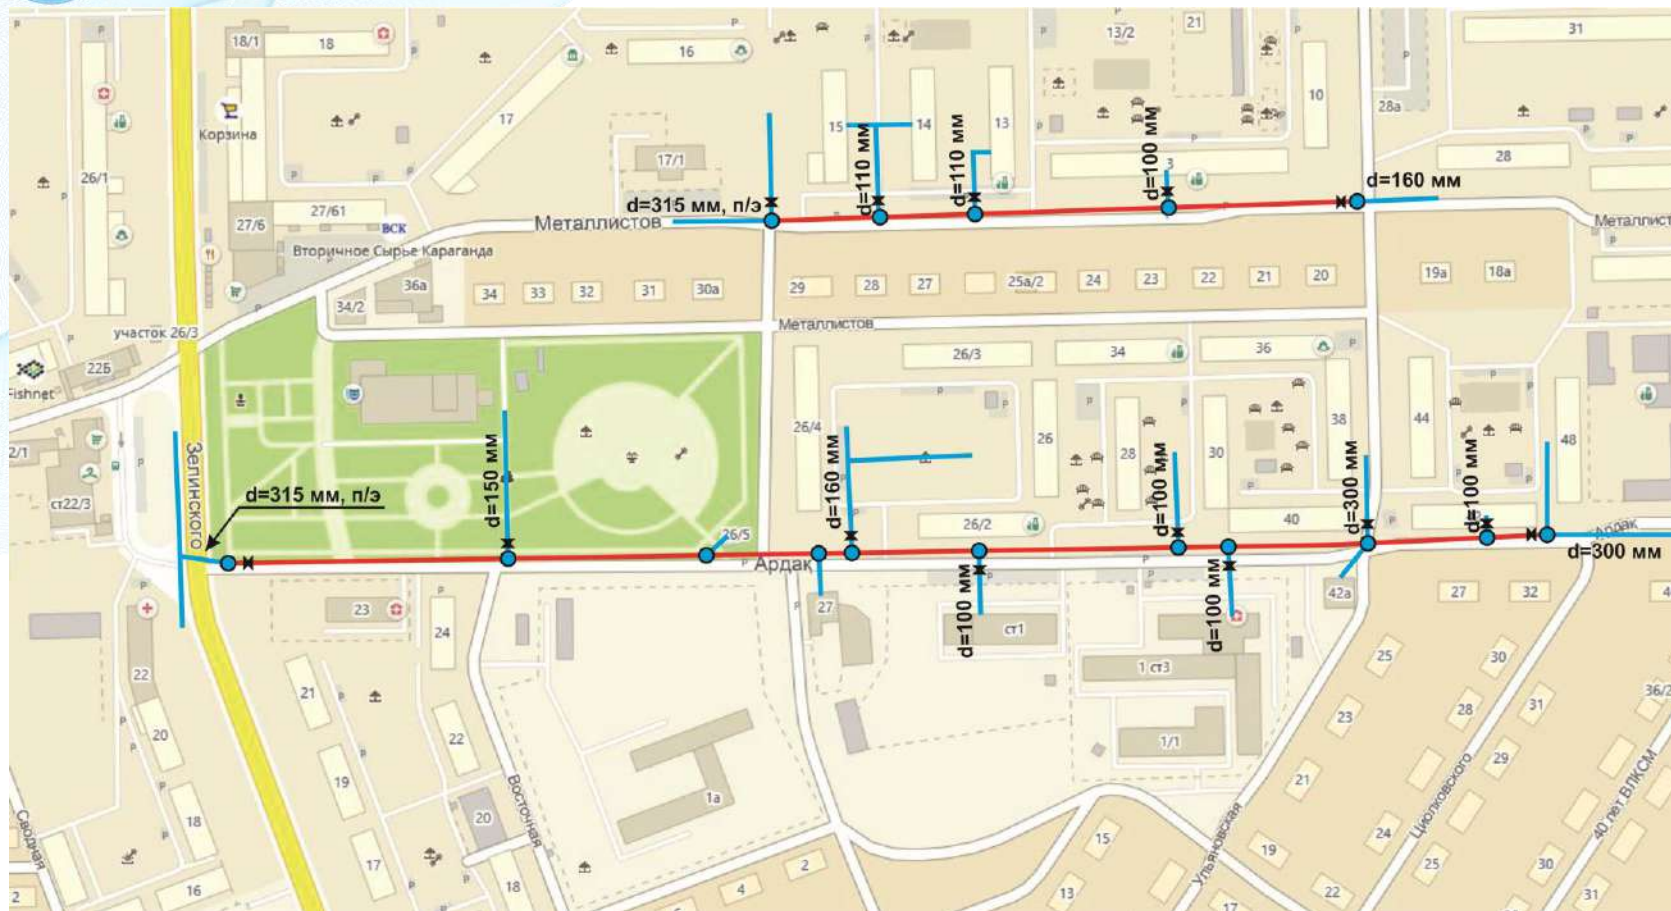

Построен в 1986 году из чугунных труб D 300 мм, L 1002 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 14 аварий.

Осуществляет водоснабжение жителей многоэтажных жилых домов 22 микрорайона.

Протяженность реконструированного аварийного участка **1 002 м D 315, п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **3 000 человек**

Стоимость 114 257,7 тыс. тенге

16. Реконструкция водопровода вокруг мкр. Восток-5 (Восток-5, от н/станции обводная) D 315



Построен в 1986 году из стальных труб D 300 мм, L 1 412 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 21 авария.

Осуществляет водоснабжение жителей мкр. Восток 5.


Протяженность реконструированного аварийного участка **1 412 м D 315, п/э**, методом ГНБ

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **5 000 человек**

Стоимость 39 839 тыс. тенге



17. Реконструкция водопровода внутри мкр.14 и к д.11 (мкр.14, д.10-5) D 200

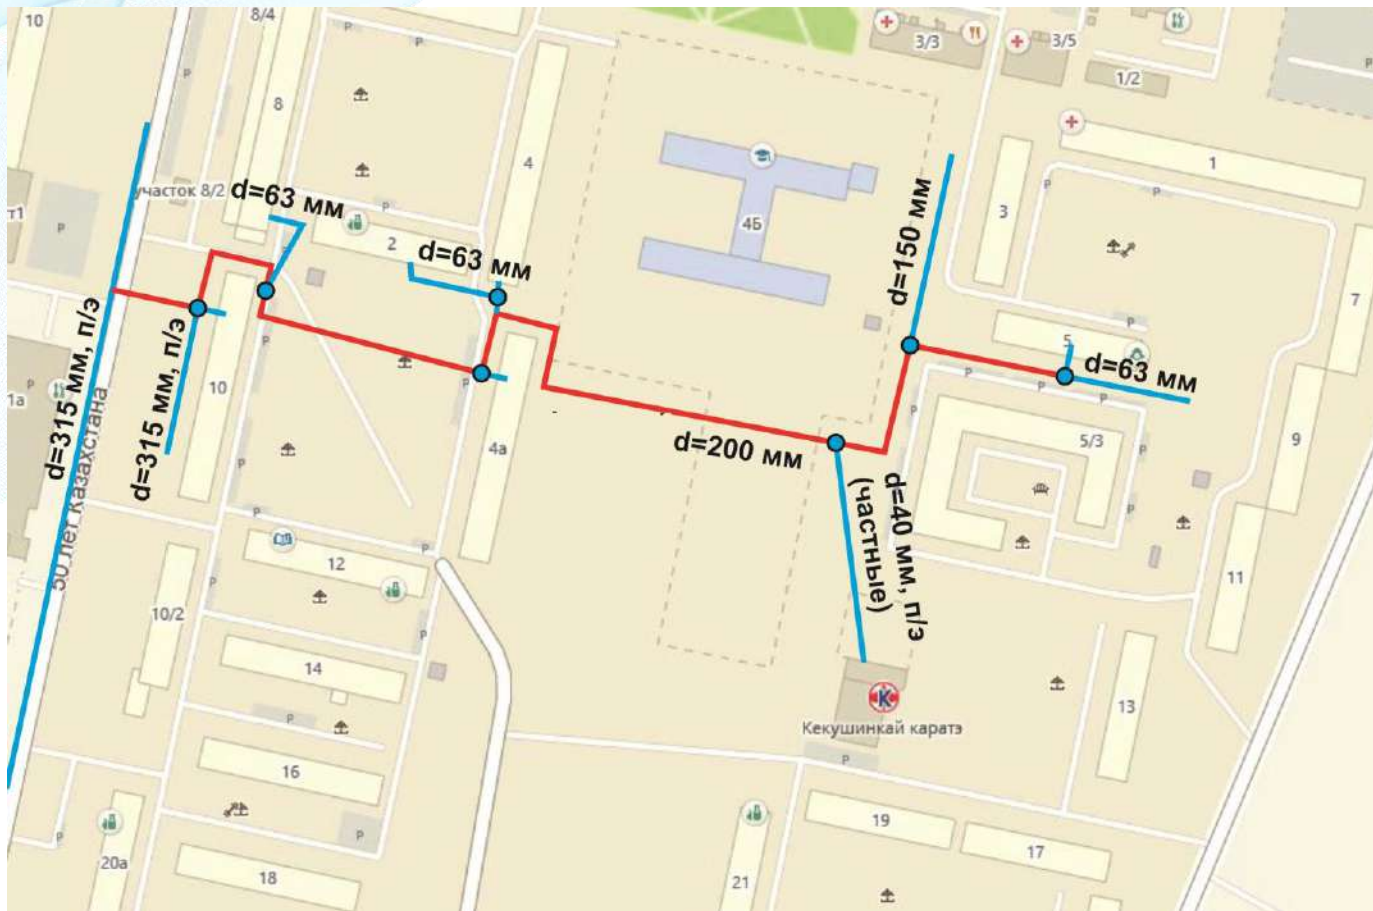

Построен в 1967 году из стальных труб D 200 мм, L 325,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 10 аварий.

Осуществляет водоснабжение жителей 14 мкр.

Протяженность реконструированного аварийного участка **325,5 м** D 200, п/э, методом ГНБ

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 21 892 тыс. тенге



18. Реконструкция водопровода 11 квартала (ул. Открытая, от Магнитогорской до Лихачева) D 110



Построен в 1958 году из стальных труб D 100 мм, L 511,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 18 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Открытой, ул. Магнитогорской, ул. Лихачева

Протяженность реконструированного аварийного участка **511,5 м D 110 п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 8 234 тыс. тенге

19. Реконструкция водопровода м-на 18-19 (ул. Петрозаводская, 155 - до мкр.18, д.11/3) D 200

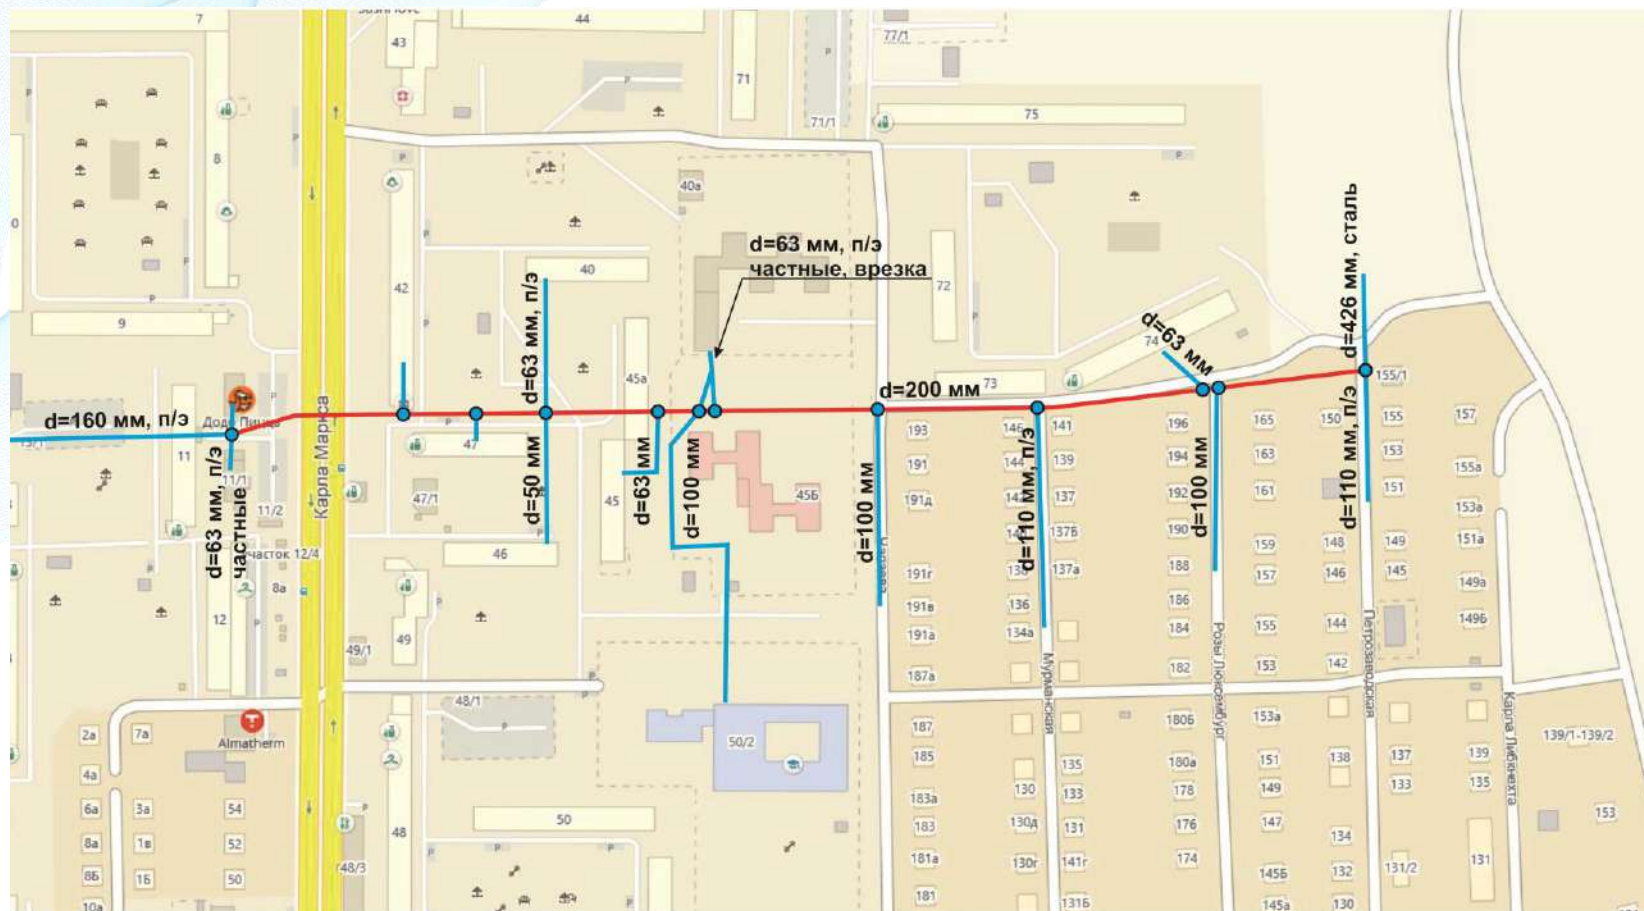

Построен в 1971 году из стальных труб D 200 мм, L 737,2 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 12 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Петрозаводской, ул. Октябрьской, мкр. 18, 19


Протяженность реконструированного аварийного участка **737,2 м** D 200 п/э, методом ГНБ

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 500 человек**

Стоимость 53 045,2 тыс. тенге



20. Реконструкция водопровода вокруг мкр. Восток-2, водопровода м-на Восток-1 (мкр. Восток-2, д.16 до д.12) D 315

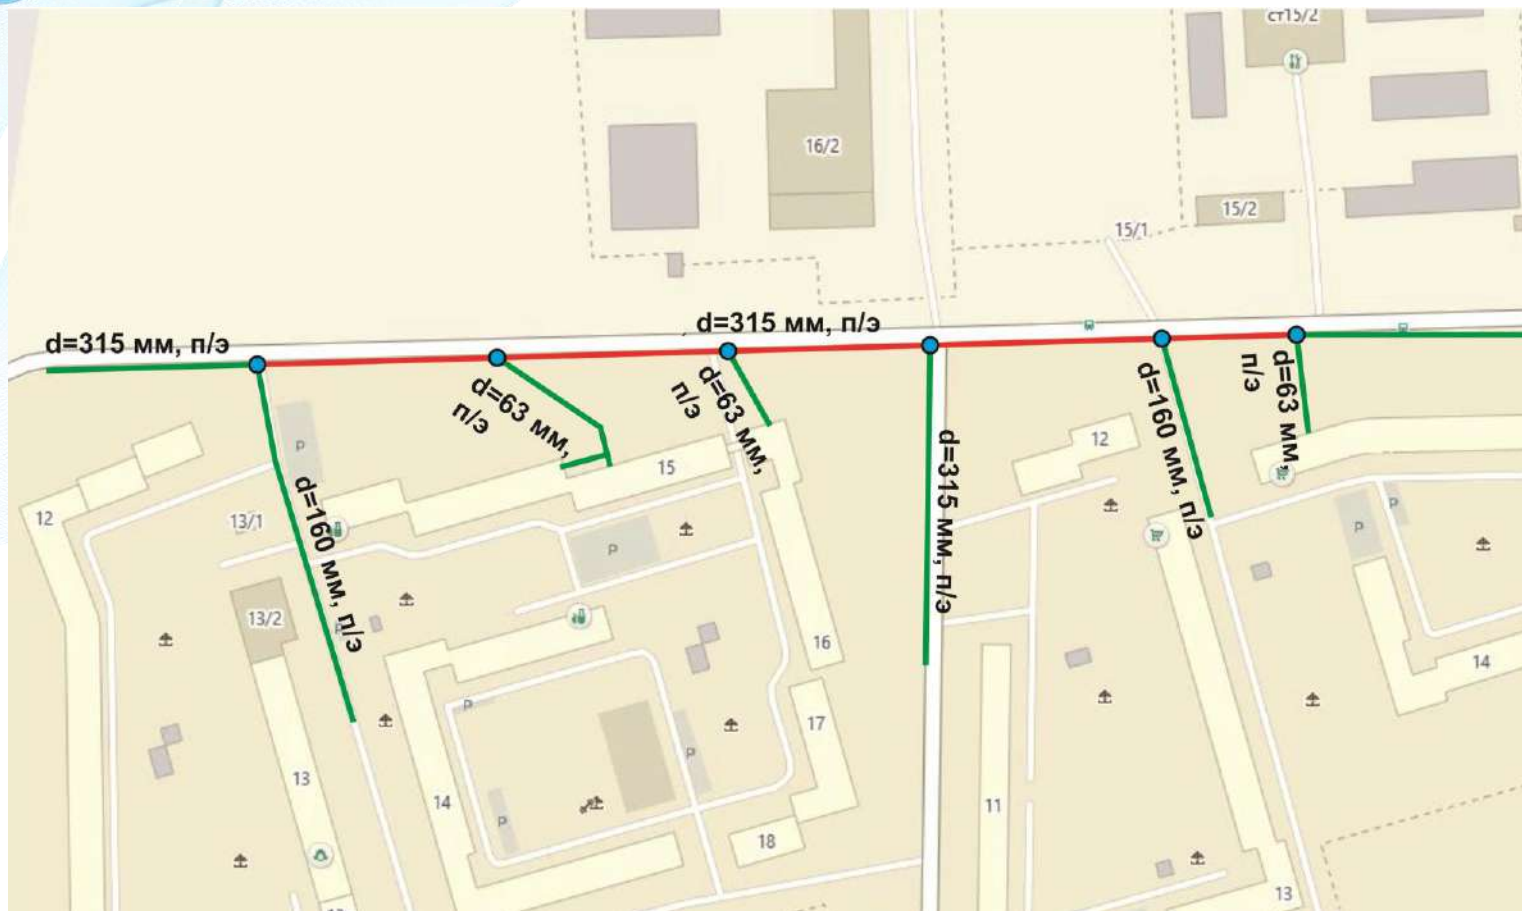

Построен в 1981 году из стальных труб D 300 мм, L 357,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 9 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей мкр. Восток 1, 2.

Протяженность реконструированного аварийного участка **357,5 м D 315 п/э**, методом ГНБ

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 000 человек**

Стоимость 25 280,4 тыс. тенге

21. Реконструкция водопровода 11 квартала, ул. Узловая (ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева) D 110

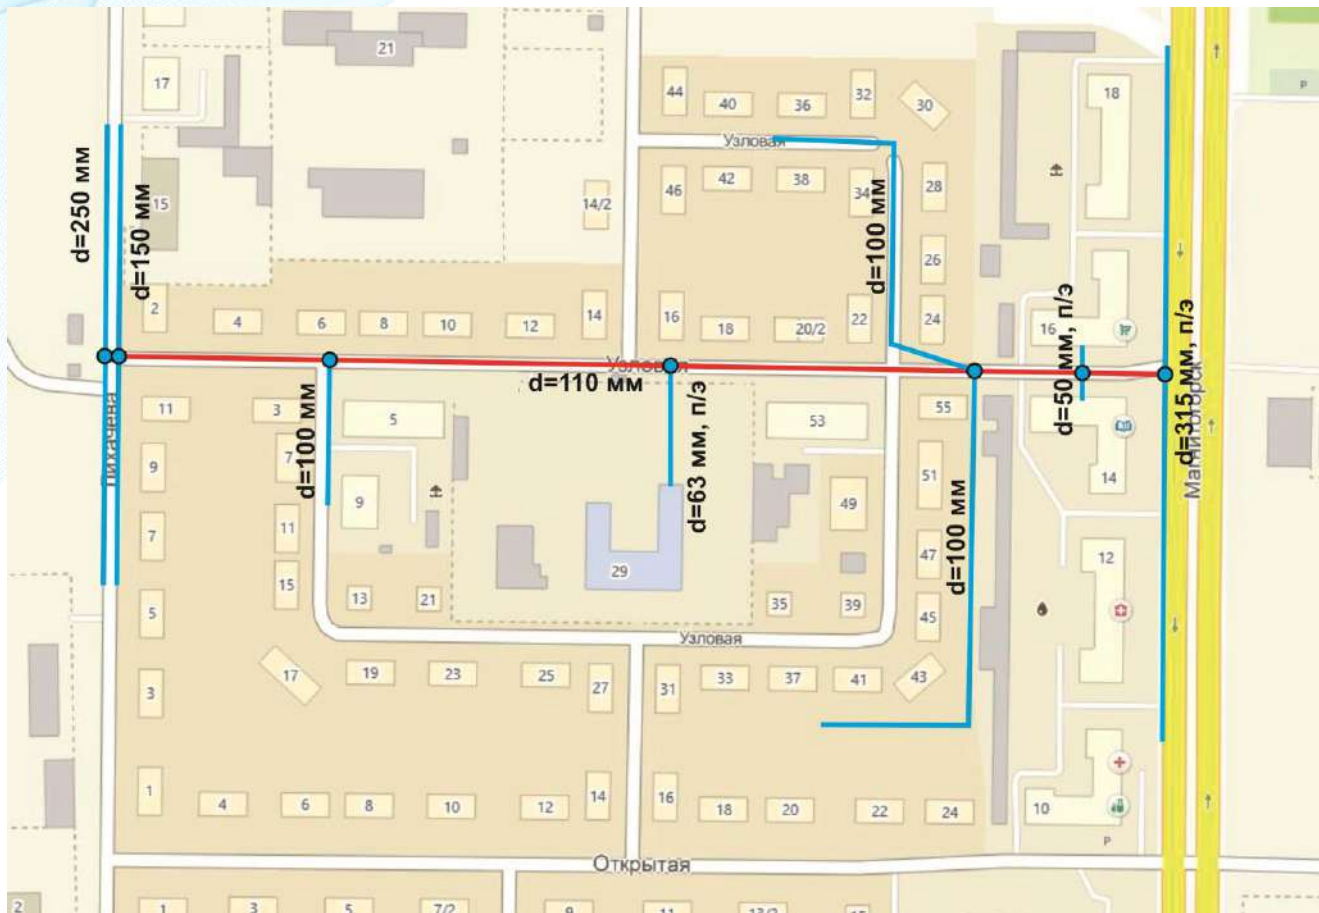

Построен в 1959 году из стальных труб D 100 мм, L 517,1 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 14 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Узловой, ул. Магнитогорской, ул. Лихачева.

Протяженность реконструированного аварийного участка **517,1 м D 110 п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 29 024,5 тыс. тенге

22. Водопровод по ул. Терешковой (ул. Терешковой, от ул. Пригородная до ул. Мустафина) D 315

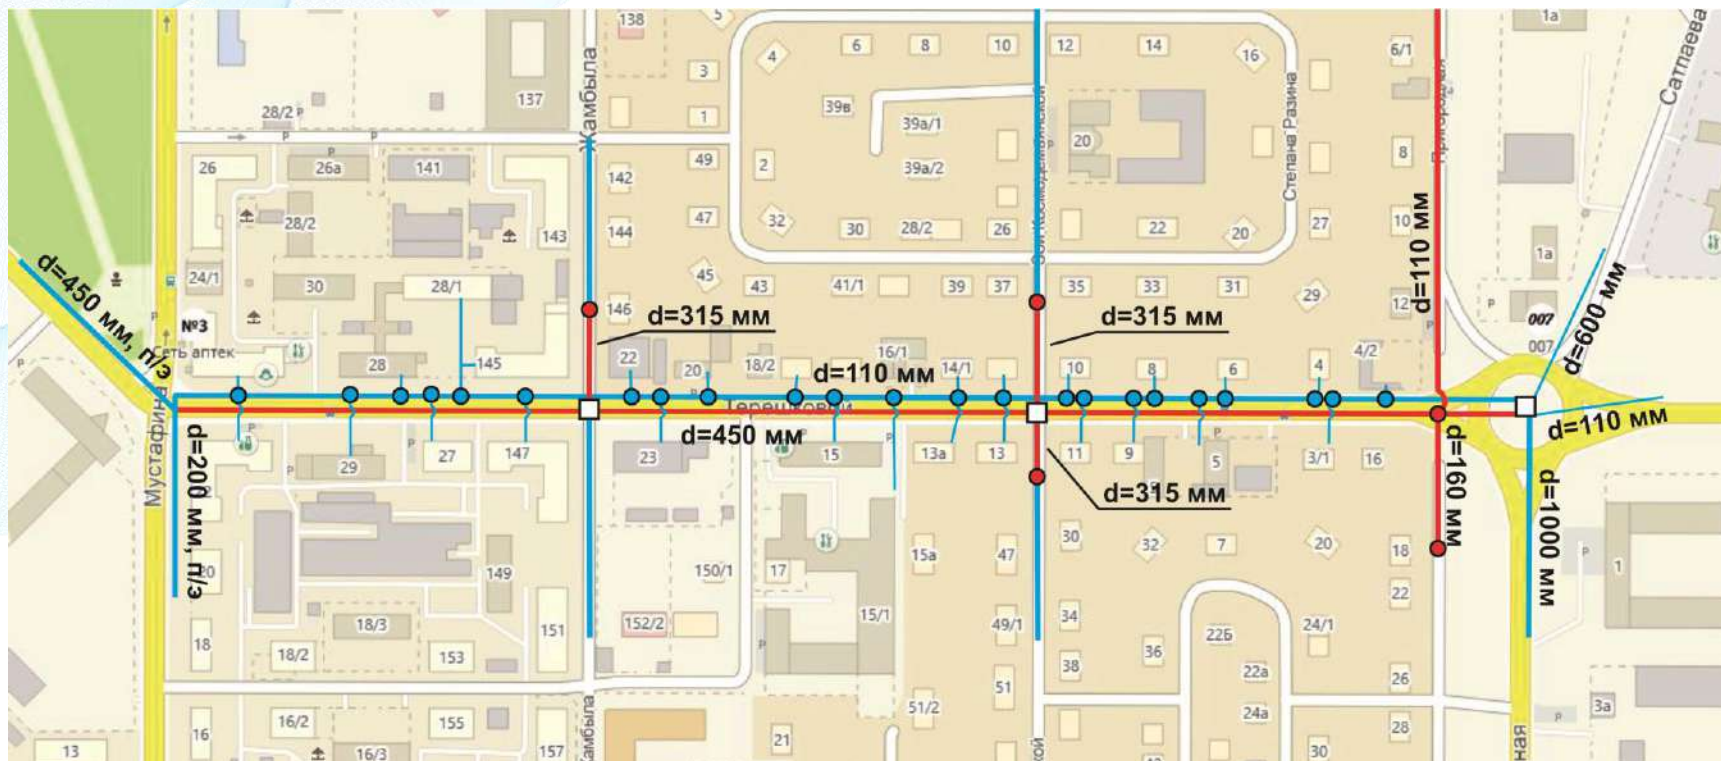

Построен в 1981 году из стальных труб D 450 мм, L 1 800,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 13 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей Нового города: ул.Терешковой, ул.Мустафина, ул.Гастелло, ул.Абая, пр.Н.Назарбаева


Протяженность реконструированного аварийного участка **1 800,5 м** D 450, 315, 160, 110 мм, п/э. методом ГНБ

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **14 000 человек**

Стоимость 179 351,7 тыс. тенге



23. Водопровод по ул. Новоселов (ул. Новоселов, д. 250 – пр. Б.Жырау д. 76) D 200

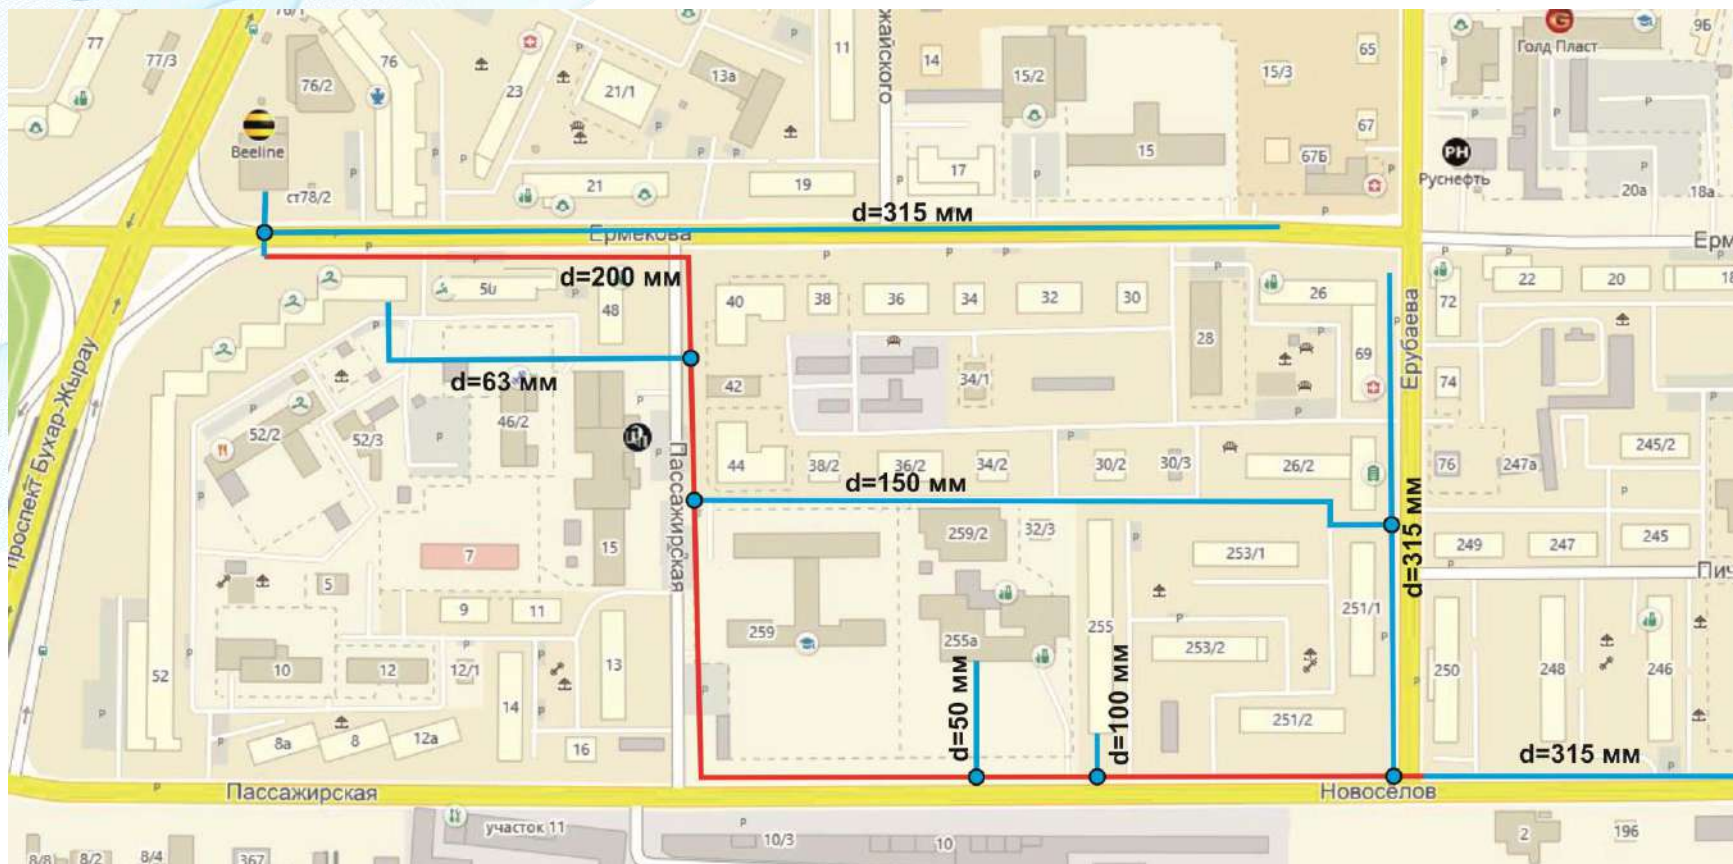

Построен в 1965 году из стальных труб D 200 мм, L 840 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 12 аварий

Протяженность реконструированного аварийного участка **840 м** D 200, п/э, методом ГНБ .

Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Новоселов

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 000 человек**

Стоимость 51 540,8 тыс. тенге

24. Водопроводные сети по Ленинскому району от УЖКХ (ул. Можайского) D 160



Построен в 1965 году из стальных труб D 150 мм, L 435 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 16 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей пр. Бухар-Жырау, ул. Комиссарова, ул. Можайского


Протяженность реконструированного аварийного участка **435 м D 160, п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 29 182,4 тыс. тенге



25. Водопровод по ул. Костенко (ул. Костенко, д. 3 – 12) D 160

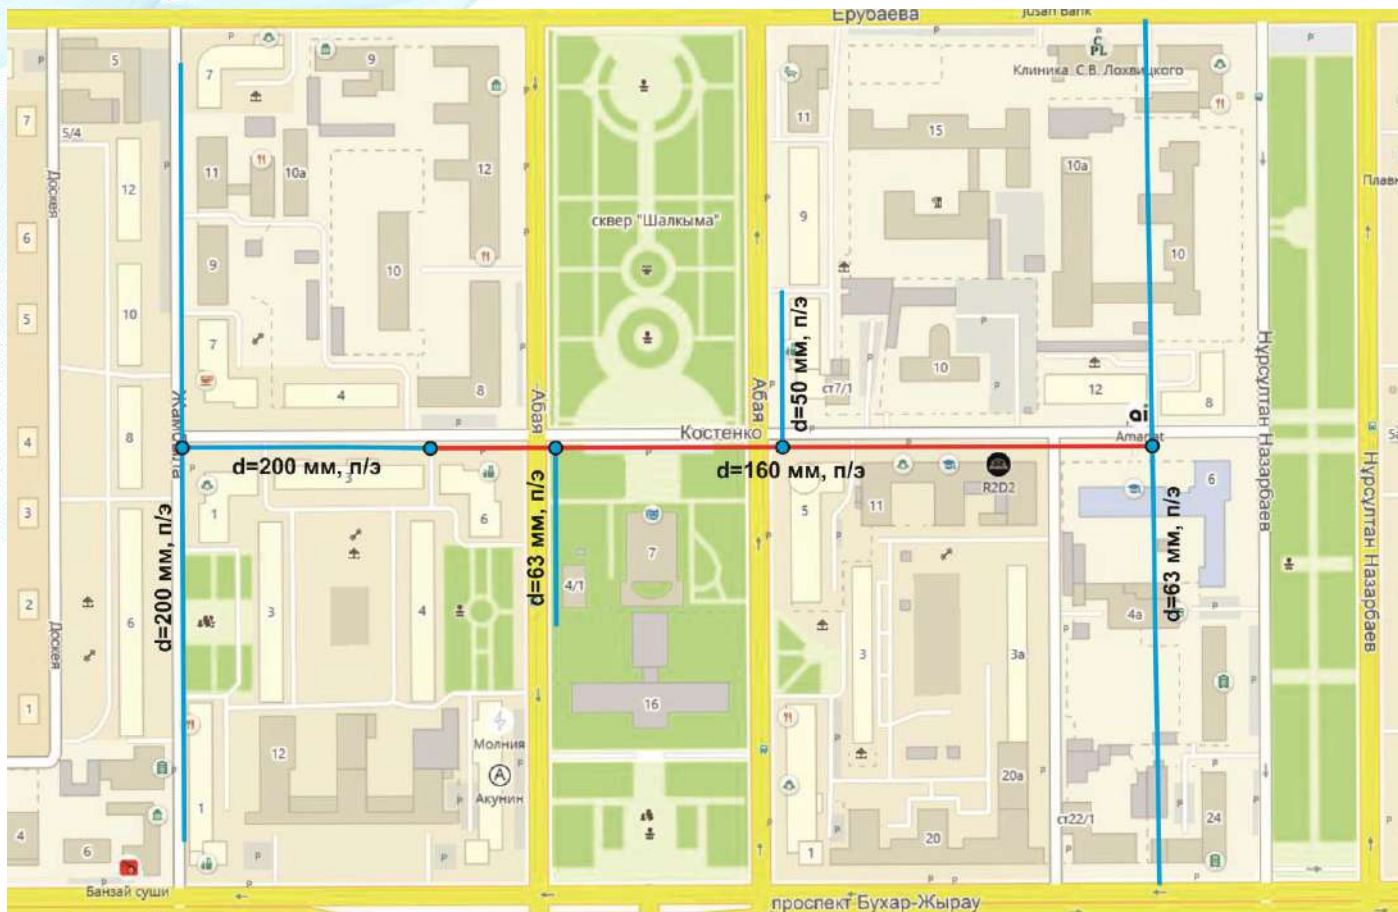

Построен в 1988 году из стальных труб D 150 мм, L 434,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 10 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Костенко, медицинские и учебные объекты.

Протяженность реконструированного аварийного участка **434,5 м** D 160, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 31 572,5 тыс. тенге



26. Водопровод по ул. Московская 2,12,14,3-3 и Вод-д по ул. Московская 10, 16-22, 15-23 (ул. Московская, 1-22) D 110



Построен в 1989 году из стальных труб D 100 мм, L 863,8 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 17 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Московская

Протяженность реконструированного аварийного участка **863,8 м D 110, п/э**. Методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 50 478,1 тыс. тенге

27. Водопровод вокруг м-на «Гульдер» (ул.Таттимбета д.19- ул Букетова) D 315

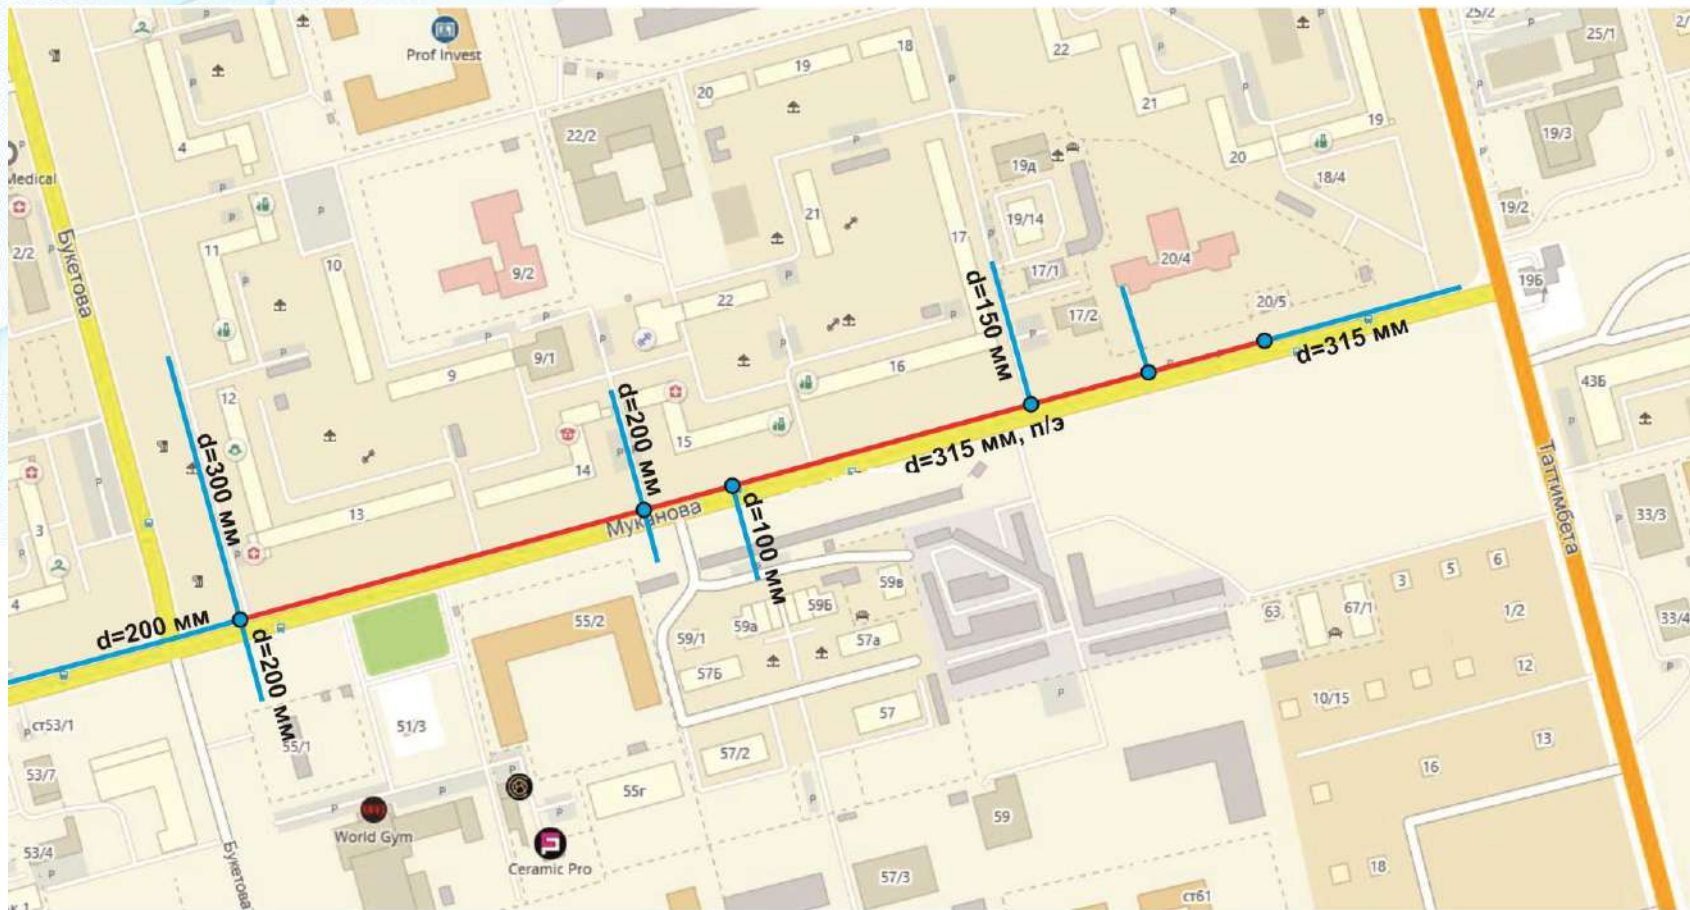

Построен в 1988 году из чугунных труб D 300 мм, L 667,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 10 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей мкр. Гульдер, ул. Таттимбета, ул. Букетова


Протяженность реконструированного аварийного участка **667,5 м D 315, п/э**, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **5 000 человек**

Стоимость 35 395 тыс. тенге



28. Водопровод к д.48-52,53,54 с маг. "Хлеб-Молоко" и 55-56 с маг. "Овоци-Фрукты" мкр. Гульдер 2 (ул. Таттимбета, д. 14-15) D 160

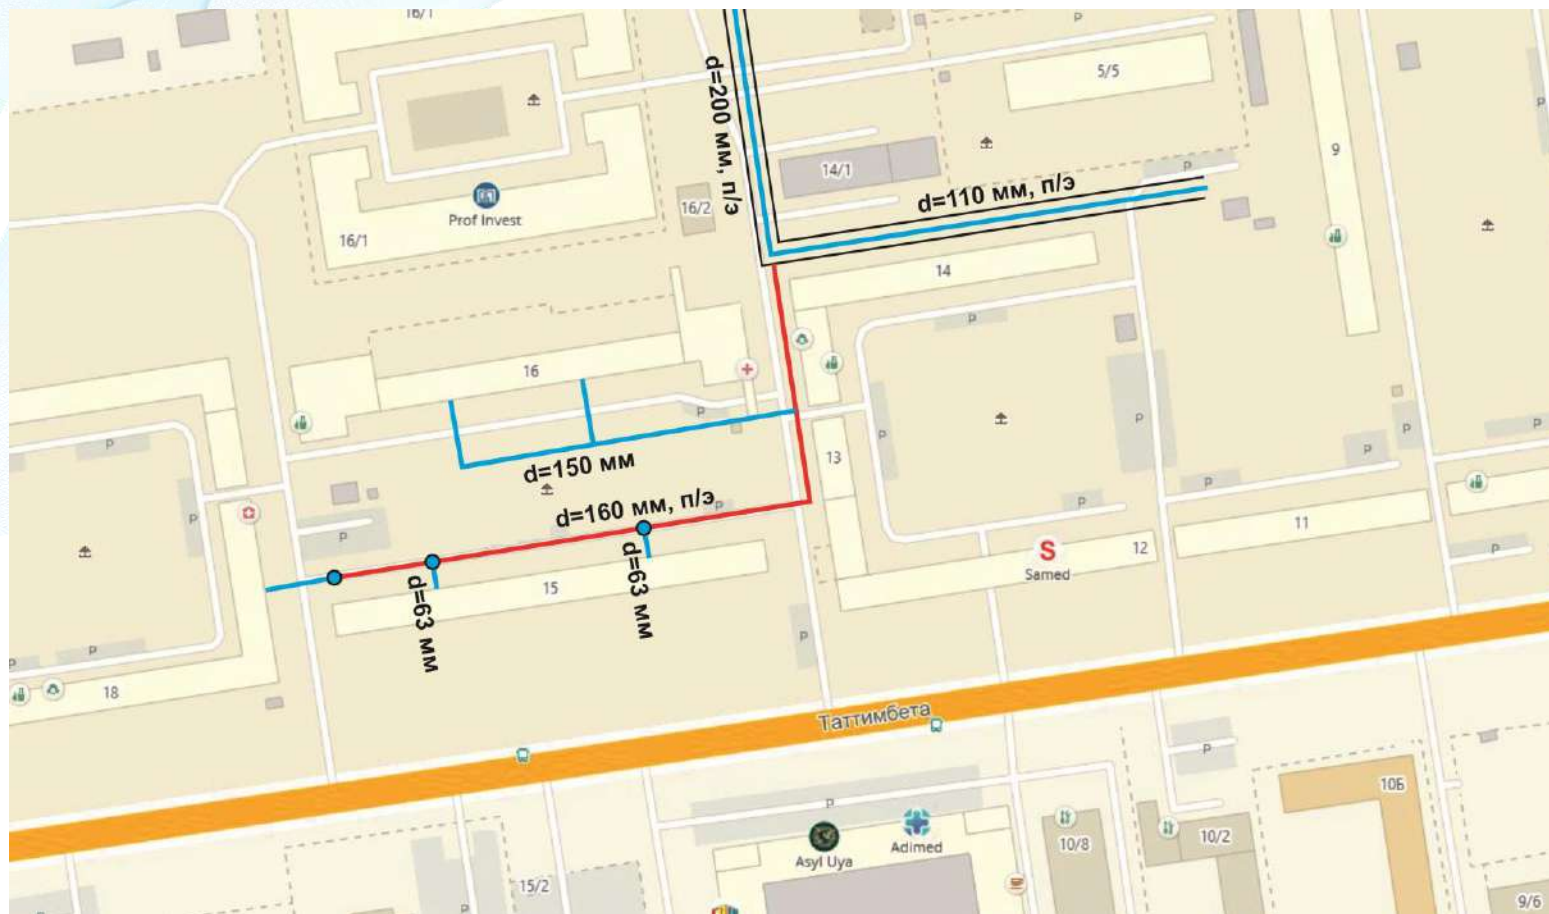

Построен в 1992 году из чугунных труб D 150 мм, L 232 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 5 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Таттимбета.

Протяженность реконструированного аварийного участка 232 м D 160, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 16 572 тыс. тенге



30. Водопровод м-на 17 к д. 38,39,42,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57 (мкр. 17, д. 49-56) D 200



Построен в 1970 году из стальных труб D 1500 мм, L 492,3 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 11 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей мкр. 17.


Протяженность реконструированного аварийного участка **492,3 м** D 200, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 000 человек**

Стоимость 34 431,8 тыс. тенге



31. Водопровод по ул. Полигонная (ул. Уральская, 1-43) D 110

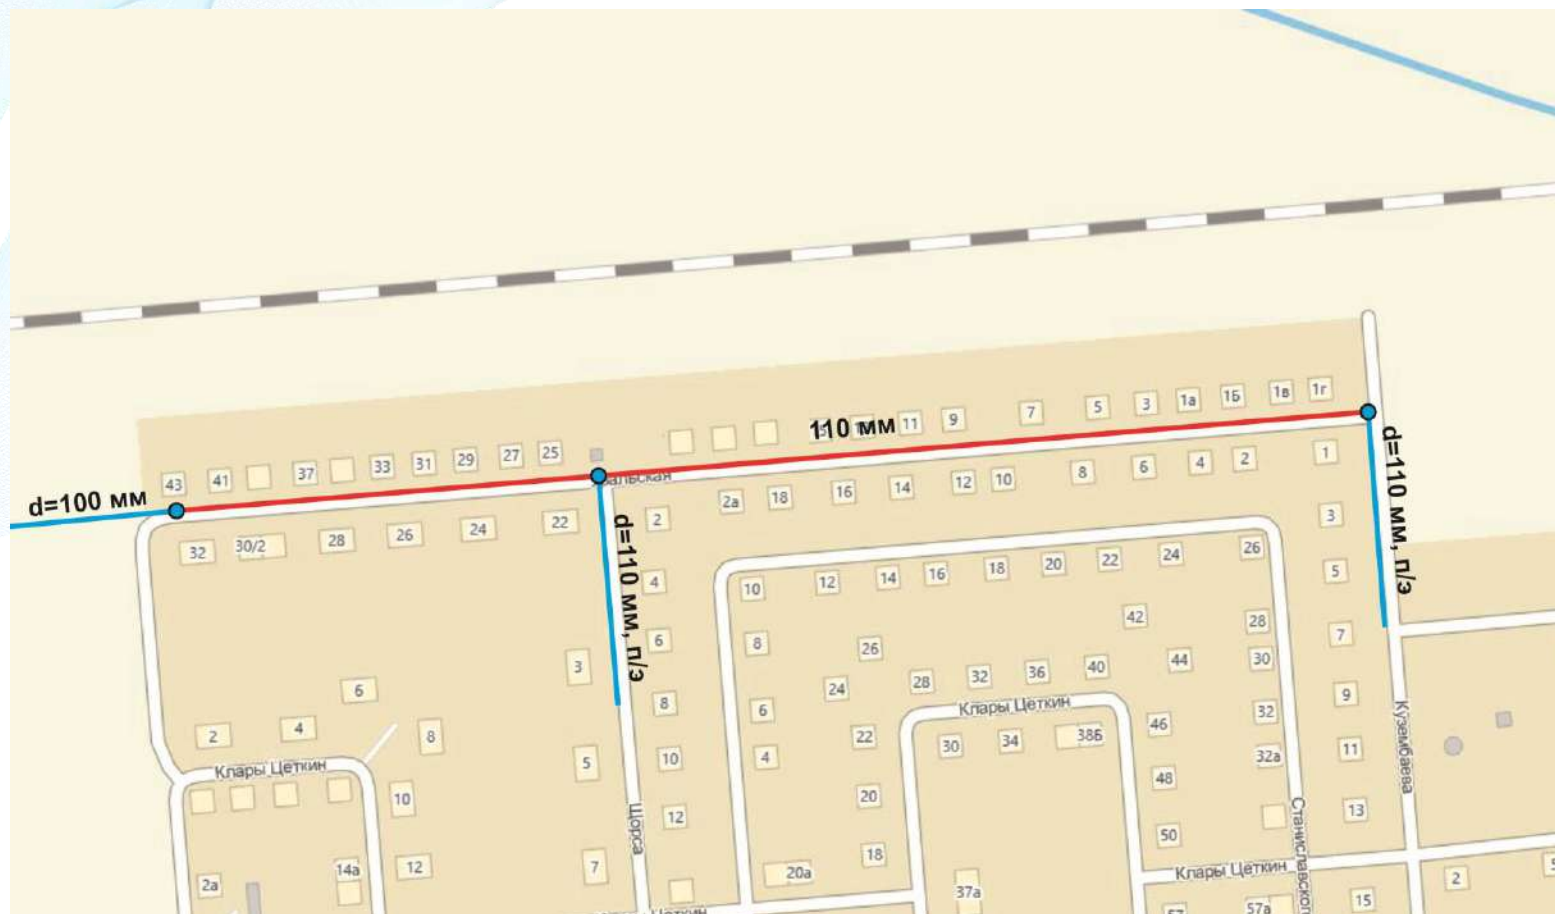

Построен в 1962 году из стальных труб D 100 мм, L 679 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 12 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей ул.Уральская.

Протяженность реконструированного аварийного участка **679 м** D 110, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 000 человек**

Стоимость 7 931,4 тыс. тенге

32. Водопроводные сети к домам Железнодорожного района ВОДЧ-7, (ул. Победы, 18-94) D 160



Построен в 1963 году из стальных труб D 100-150 мм, L 1 322,2 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 19 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Победы

Протяженность реконструированного аварийного участка **1 322,2 м** D 110-160, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 000 человек**

Стоимость 81 460,5 тыс. тенге



33. Водопровод в рабочем поселке Актас (ул. Привольная, 8-78) D 160



Построен в 1950 году из стальных труб D 150 мм, L 1 531 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 25 аварий.


Осуществляет водоснабжение потребителей ул. Привольная

Протяженность реконструированного аварийного участка **1 531 м** D 160, п/э, методом ГНБ.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **2 000 человек**

Стоимость 36 249 тыс. тенге

34. Водопровод пос. Кир.з-да 4-5 (Водопровод на Кирзавод 3-4) D 200

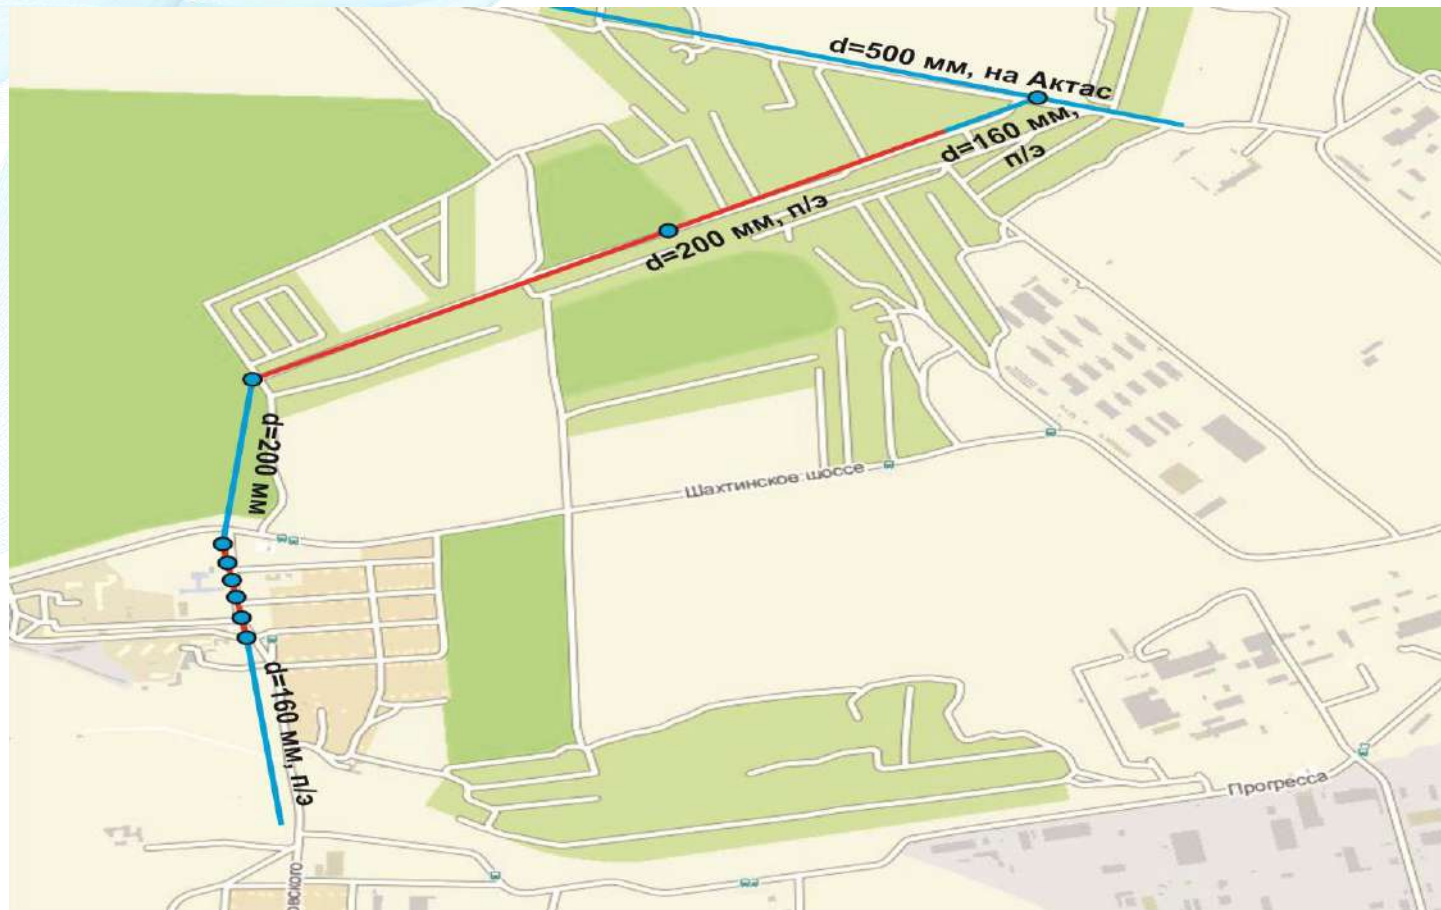

Построен в 1966 году из стальных труб D 200 мм, L 1 773,5 м, **износ 100%**

За период 2019-2023 гг. на нем возникло и ликвидировано 25 аварий.

Осуществляет водоснабжение потребителей Кирзавода 3-4 (ул. Осевая, ул. Брюллова, ул. Мицкевича, ул. Петровского, ул. Кошубаева).

Протяженность реконструированного аварийного участка **1 773,5 м D 200, п/э**, открытым способом.

После реализации данного проекта улучшилось водоснабжение около **1 500 человек**

Стоимость 44 361,6 тыс. тенге




Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2024 год, млн. тенге

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Отклонение		Пояснение
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1.	Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт сетей		19 410	3 315	19 410	2 176	0	-1 139	Экономия в результате конкурсных процедур; на проведение технического надзора; применение более эффективных методов и технологий.
1.1	Капитальный ремонт канализационных сетей 14 объектов	метр	19 410	3 315	19 410	2 176	0	-1 139	
	в том числе Мероприятия по нац. проекту "Тариф в обмен на инвестиции"	метр	17 427	3 107	17 427	1 989	0	-1 118	
2.	Раздел 2. Станция Аэрации		1	11	1	7	0	-4	
2.1	Замена напорной задвижки Д-600 с обрезаем. клином с эл.приводом	раб.	1	11	1	7	0	-4	
3.	Раздел 3. Погашение основного долга	млн. тг.		321		321		0	За счет экономии по исполнению ИП
	Направления использования экономии					1 143			
4.	Приобретение новых основных средств:	ед.			84	302			
4.1	- авто- и спец. техники	ед.			7	247			2 илососные машины, 2 аварийно-ремонтных мастерских, 3 автомобиля ГАЗ
4.2	- оборудования	ед.			77	55			Насосы, аппараты для пайки труб, приборы для лаболратории, серверы, компьютеры, расходомеры, генератор, мебель
5.	Капитальный ремонт оборудования и сооружений	ед.			2	88			Кап. ремонт насосных агрегатов на КНС, монтаж системы видеонаблюдения
6.	Выплаты по договору финансового лизинга	млн. тг.				287			Приборы учета
7.	На увеличение зар. платы сотрудников сверх уровня тарифной сметы	млн. тг.				465			
ВСЕГО за 2024 год				3 647		3 647		0	



1. Канализация Нов.города, ув.70 (Коллектор по пр.Б.Жырау, от ул.Ленина,1 до врезки в коллектор по пр.Н.Назарбаева)

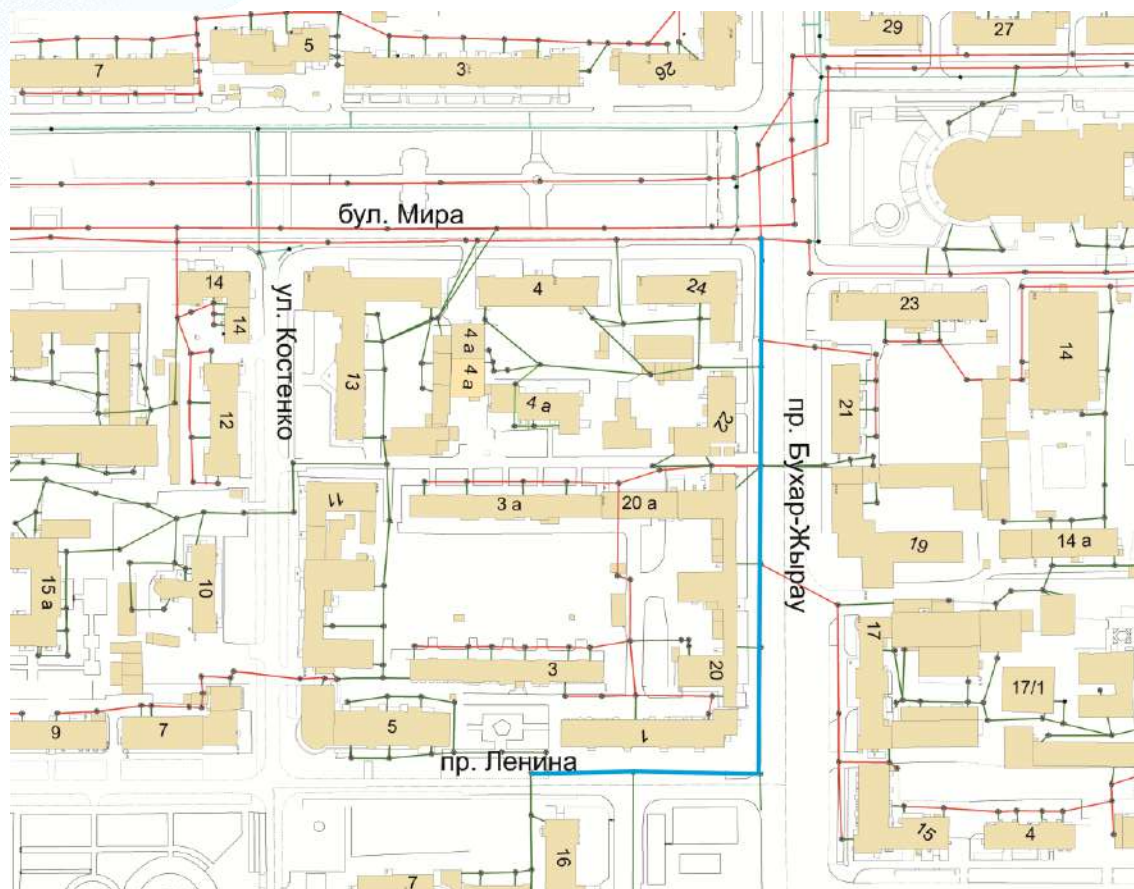

Построен в 1958 году из чугунных, асбестоцементных и керамических труб, **износ 100%**
D 160-200 мм, L 361,5 м


Транспортирует сточные воды от жилых домов и социальных объектов ул.Ленина

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **1000 человек**

Стоимость 34 095,7 тыс. тенге



2. Канализация к д. 5,15,12,20 М-27 (ул. Язева 17)

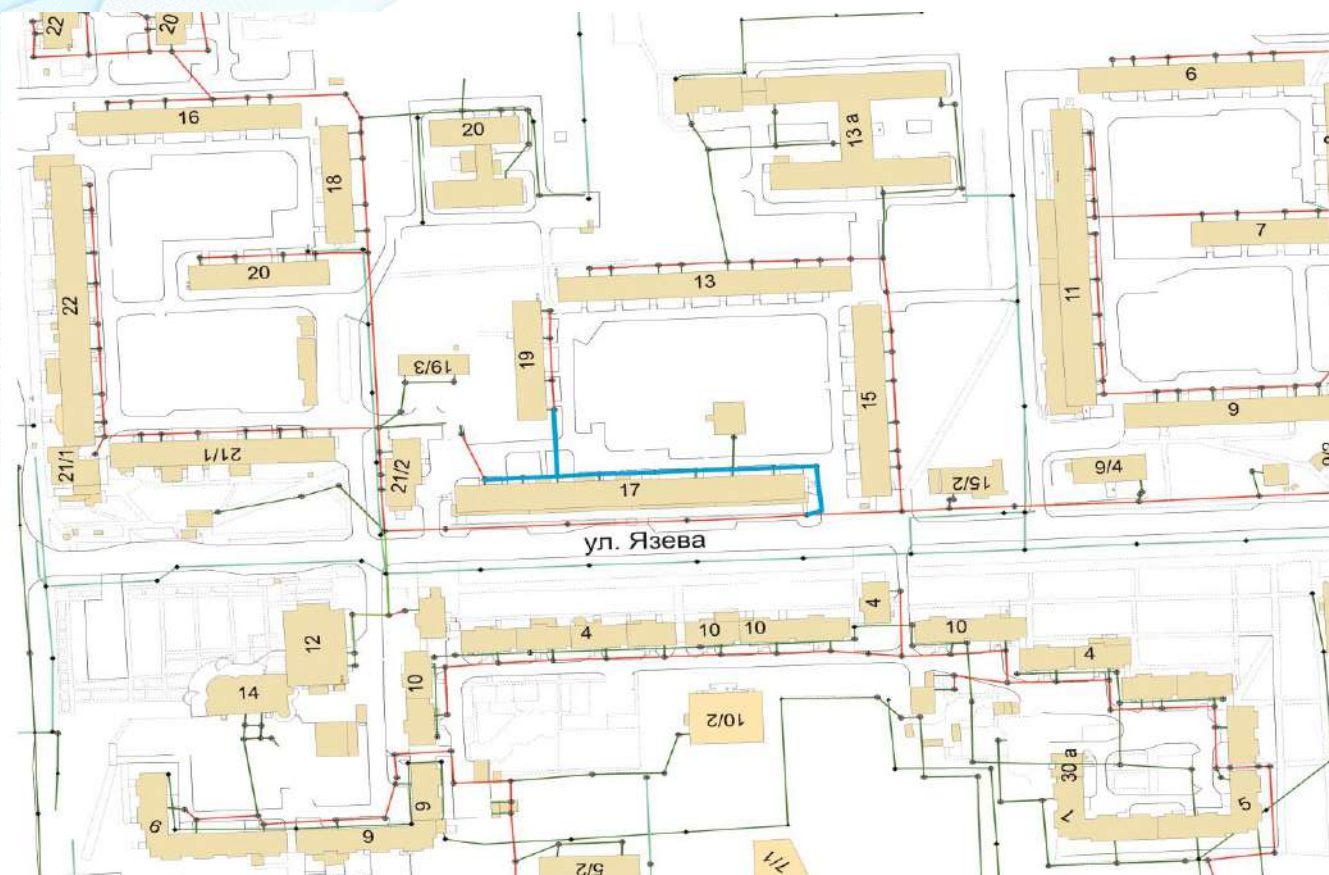

Построен в 1977 году из чугунных и керамических труб, **износ 100%**

D 160-200 мм, L 195,6 м


Транспортирует сточные воды жилых домов по ул.Язева

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **1000 человек**

Стоимость 13 372,7 тыс. тенге



3. Канализация к д. 19 20 м-на Орбита

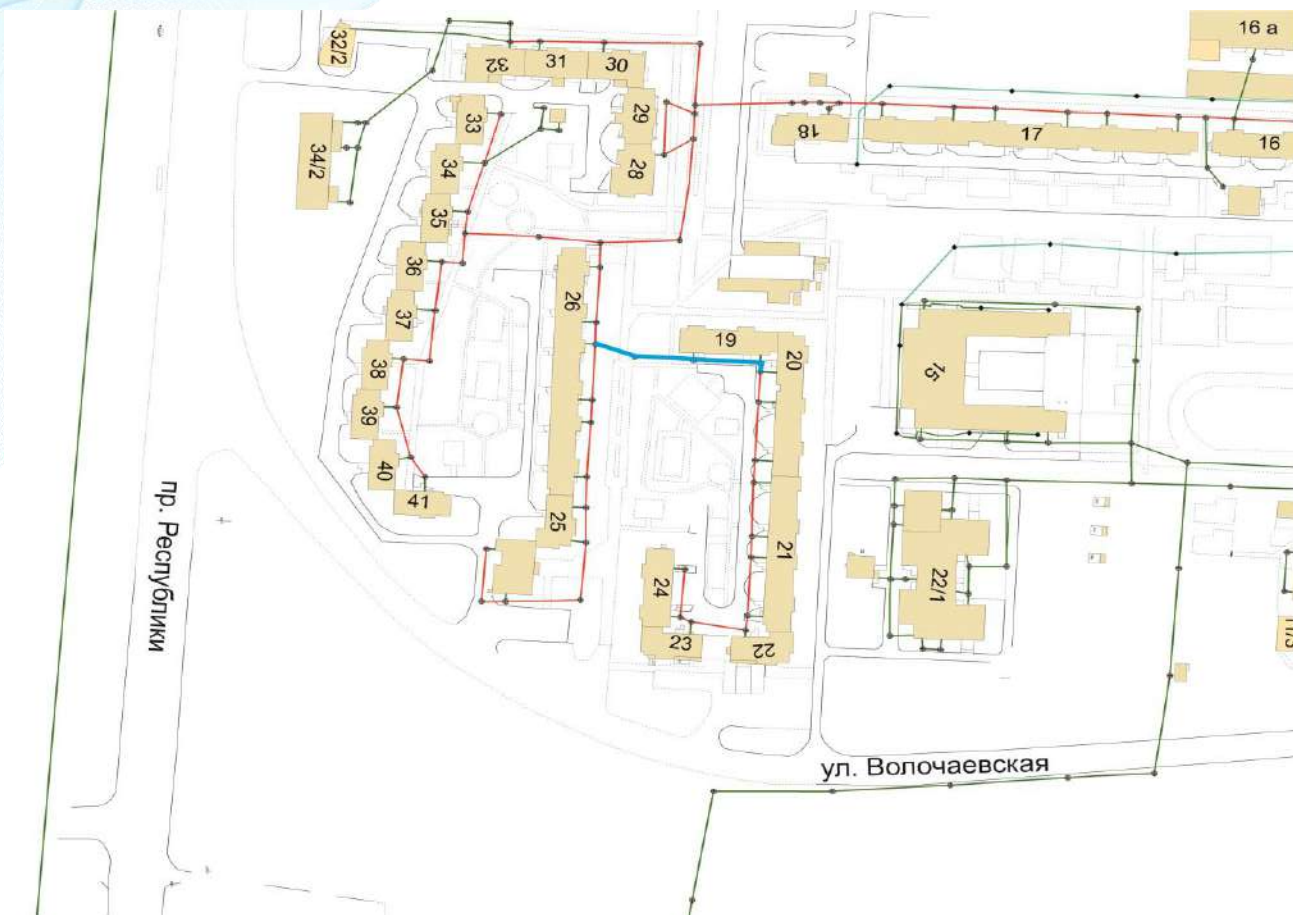

Построен в 1984 году из керамических труб, **износ 100%**

D 160-200 мм, L 109,5 м


Транспортирует сточные воды от жилых домов и социальных объектов м-на Орбита

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **800 человек**

Стоимость 4 819,7 тыс. тенге



4. Канализация Д/У 5 Н.Майкудук (мкр.12 д.7, 9, 11а)

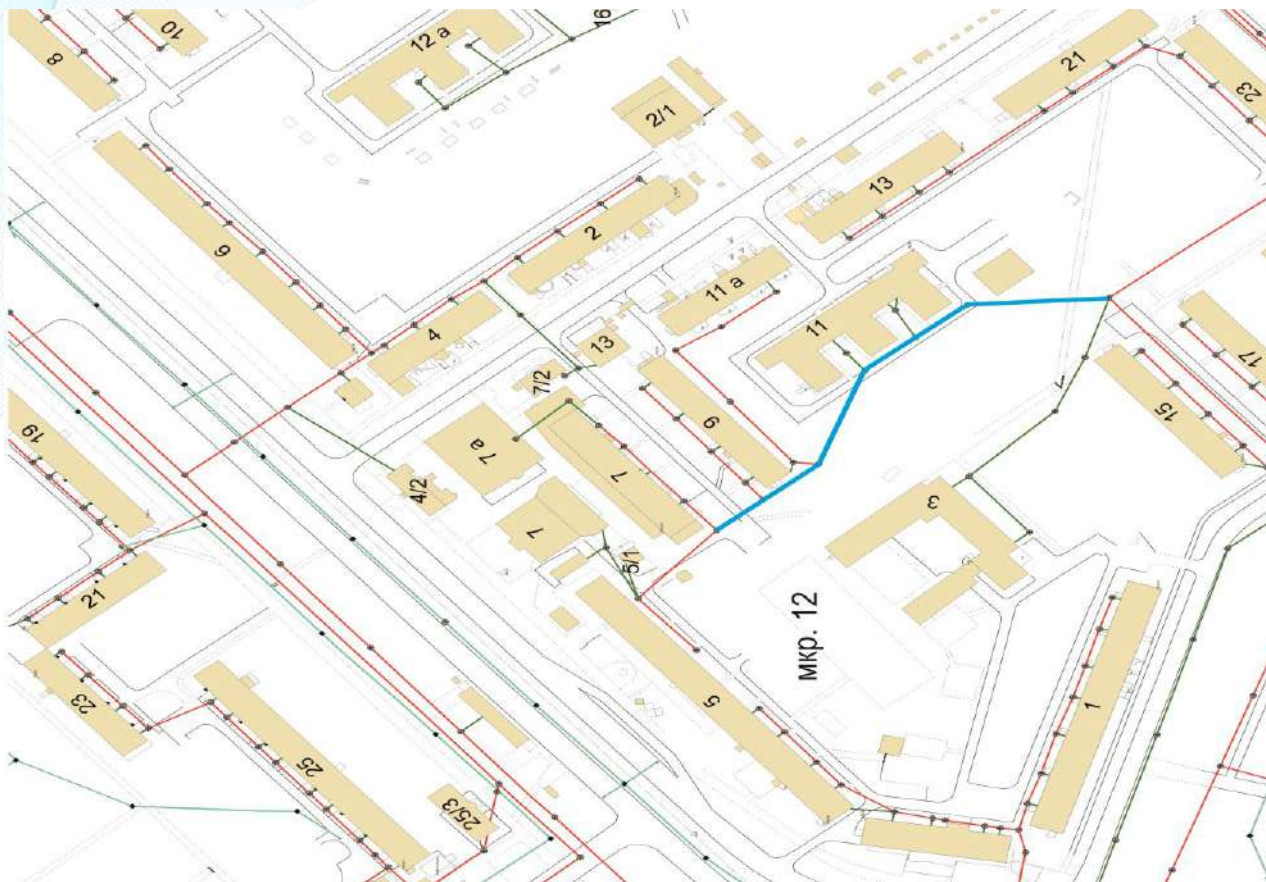

Построен в 1969 году из керамических труб, **износ 100%**

D 180-200 мм, L 196,5 м

Транспортирует сточные воды от многоэтажных жилых домов Н.Майкудука, мкр.12

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **900 человек**

Стоимость 20 201 тыс. тенге



5. Канализация М-22 д.3, 10-15, 19, 21, 25, Пришахтинск (мкр. 22 д.3-10)



Построен в 1970 году из керамических труб, **износ 100%**

D 160 мм, L 165 м


Транспортирует сточные воды жилых домов Пришахтинска, мкр.22

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **800 человек**

Стоимость 7 301,3 тыс. тенге



6. Канализация д/управления 3 Пришахтинск, Канализация м-н 21 дом 26 (ул.Зелинского д.24/1, 26/1, 26/1-28/1, 30/1-32)

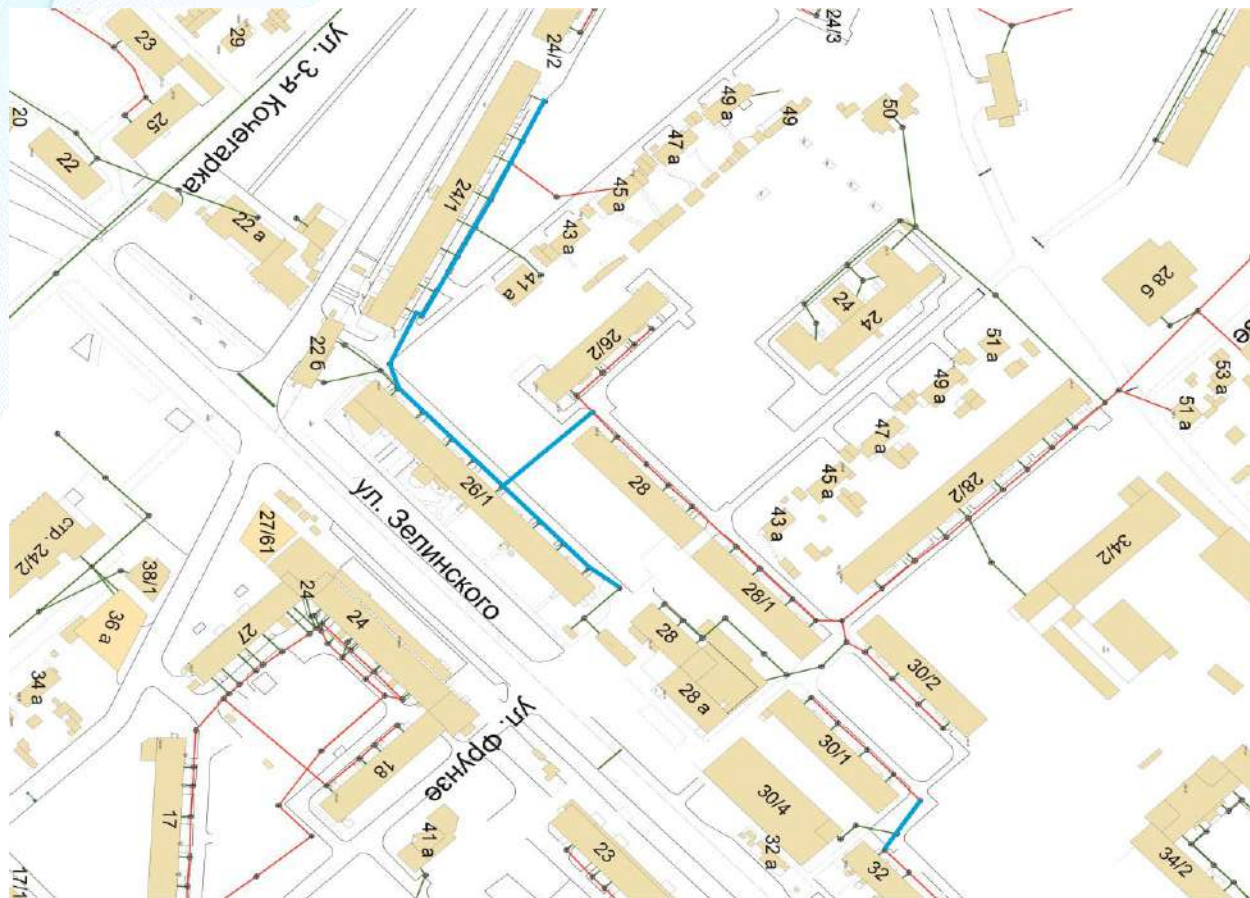

Построен в 1969 году из керамических труб, **износ 100%**


D 160-180 мм, L 334,5 м

Транспортирует сточные воды жилых домов Пришахтинска мкр.21, ул.Зелинского

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **1 000 человек**

Стоимость 16 194,2 тыс. тенге

7. Коллектор от М-5, 6, 7, 8, 9 (участок коллектора вдоль д.17 в мкр.15)

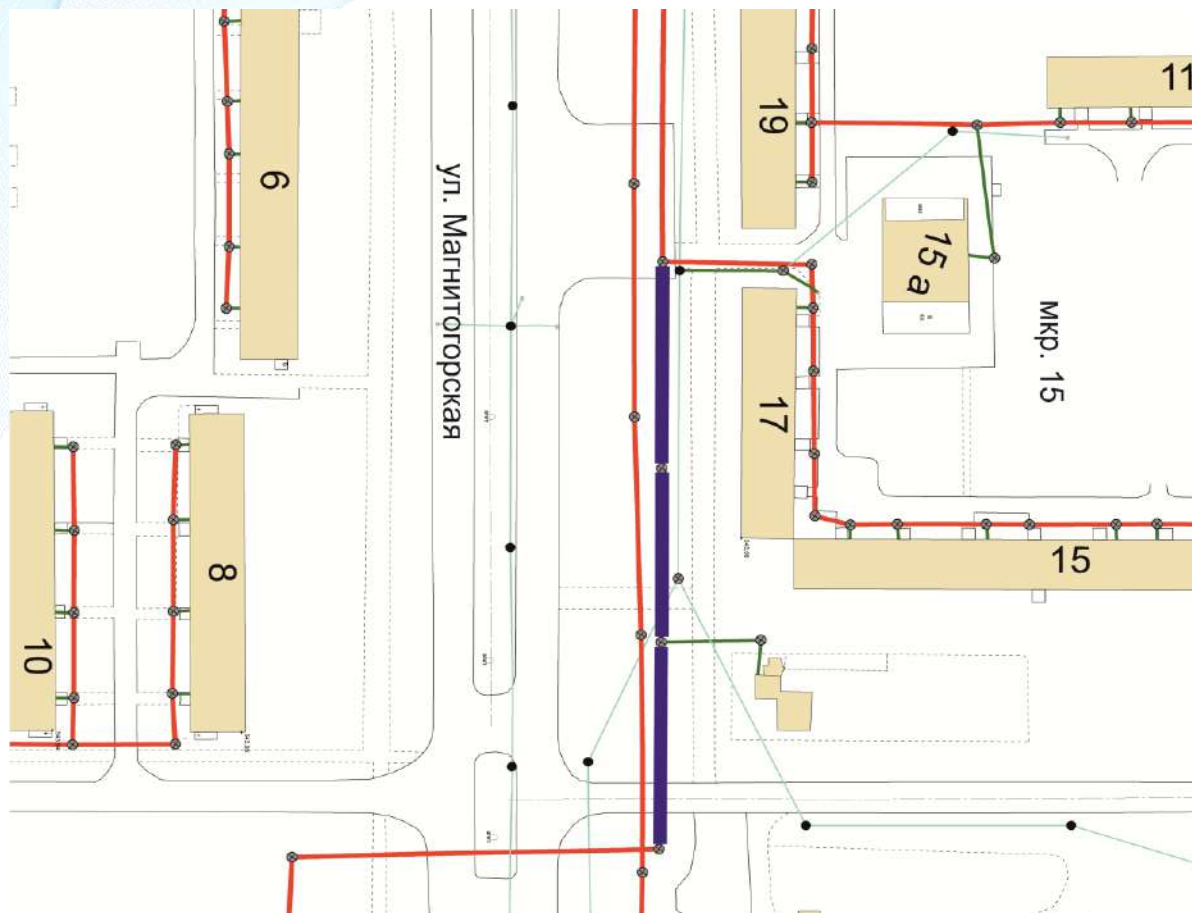

Построен в 1967 году из железобетонных труб, **износ 100%**

D 500 мм, L 137 м

Транспортирует сточные воды жилых домов 15-16 мкр.

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение **около 7 000 человек**

Стоимость 33 539,9 тыс. тенге





9. Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-13



Построен в 1972 году из стальных и железобетонных труб , **износ 100%**

D 800 мм, L 10 999,2 м


Транспортирует сточные воды от населения и промышленности Сортировки и всего Майкудука .

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **90 000 человек**

Стоимость 1 580 186 тыс. тенге



10. Реконструкция Канализационных сетей по Ленинскому р-ну от Карагандинского УЖКХ (Коллектор по автодороге по ул.Сатпаева от д. 21 до д.51, коллектор по ул.Гастелло от д.24 до коллектора по ул.Толепова)

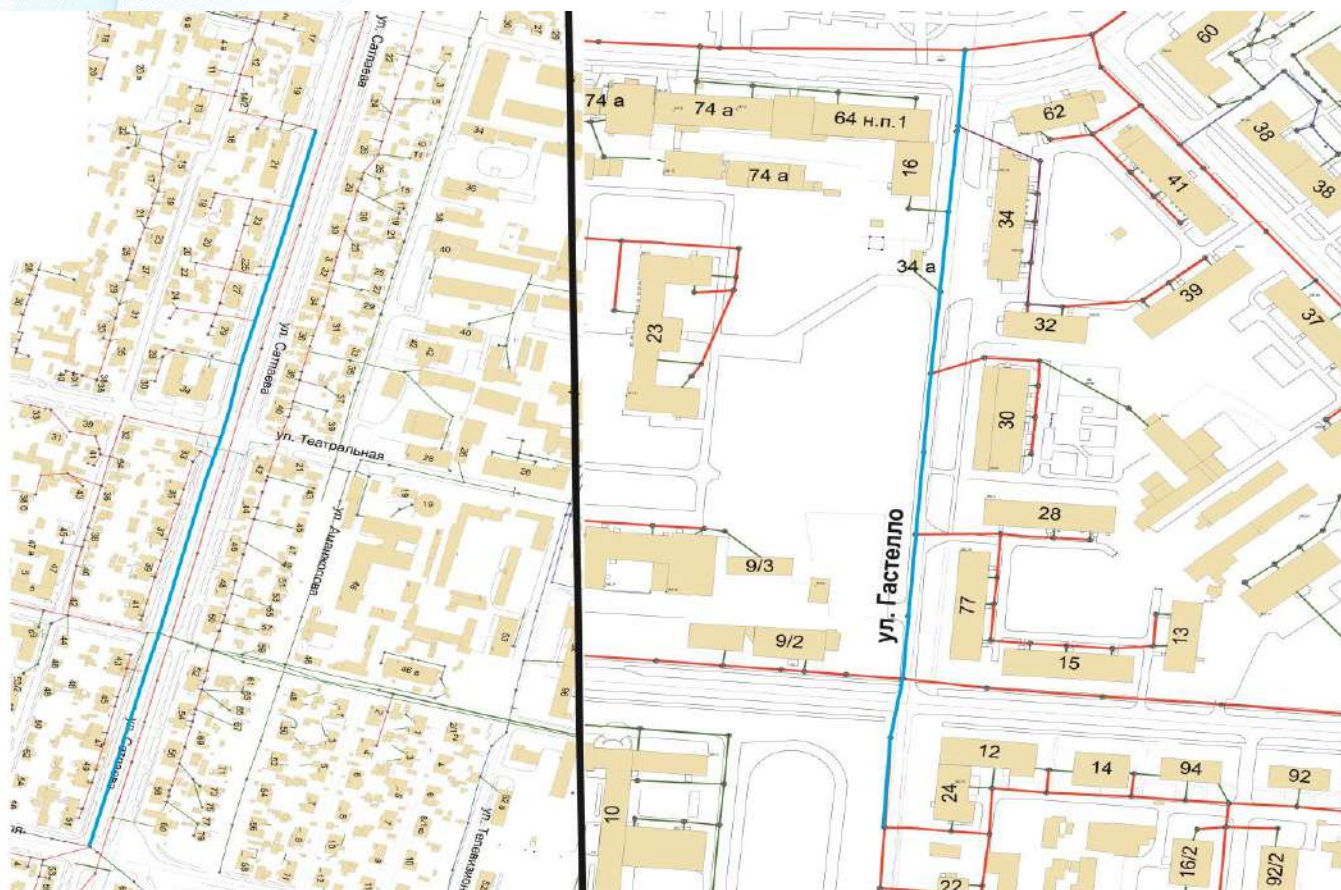

Построен в 1964-1965 годы из чугунных и керамических труб, **износ 100%**

D 160-200 мм, L 1 193 м

Транспортирует сточные воды от населения и социальных объектов ул.Сатпаева, ул.Гастелло, ул.Толепова, ул.Сарсекова, ул.Жамбыла, пер.Цикличный .


После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **11 000 человек**

Стоимость 115 327,3 тыс. тенге





12. Реконструкция коллектора по ул. 3.Космодемьянской

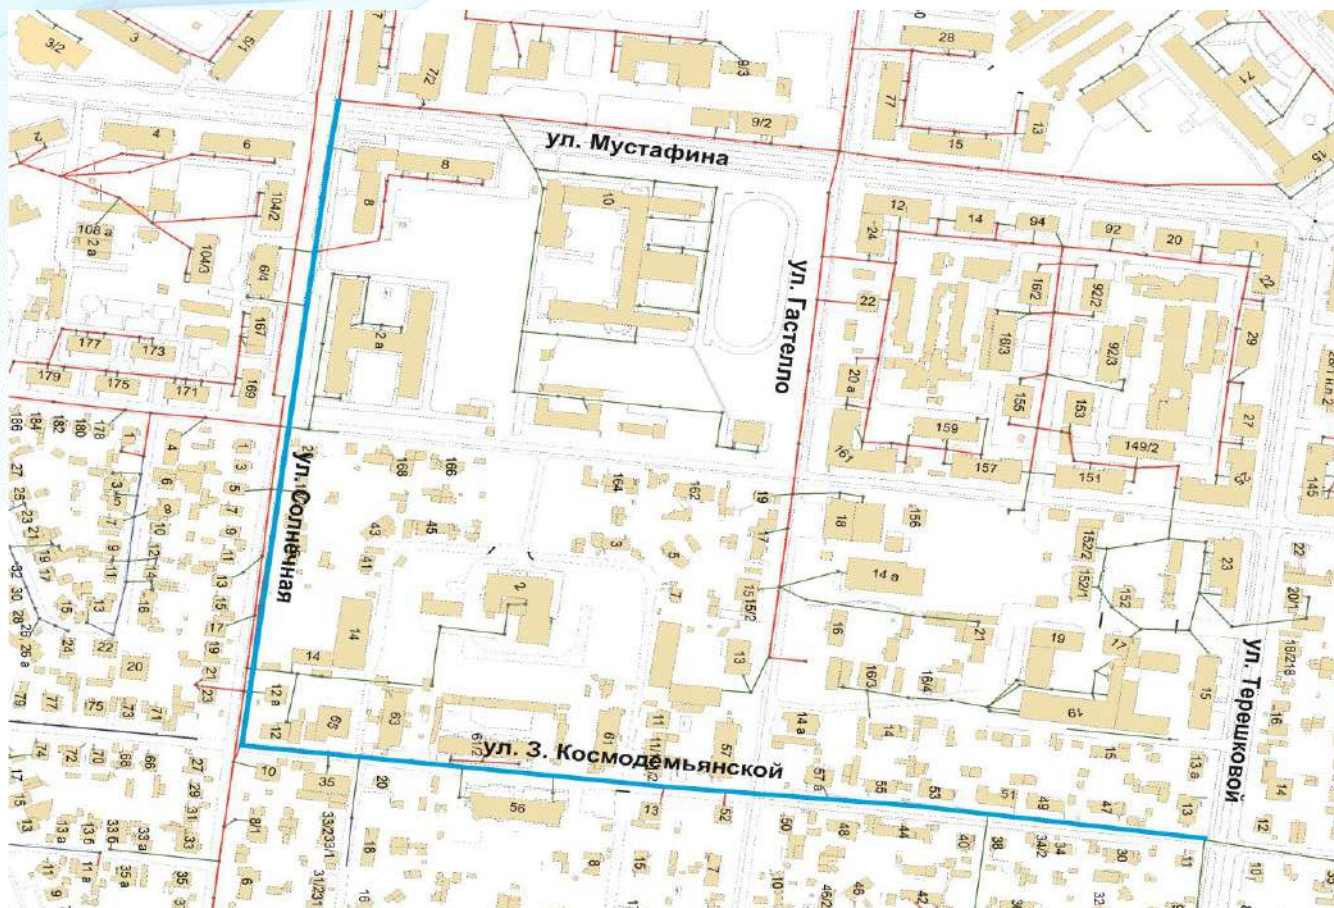

Построен в 1966 году из керамических труб, **износ 100%**

D 150 мм, L 1024 м

Транспортирует сточные воды от жилых домов ул.3.Космодемьянской.

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение **около 9 000 человек**

Стоимость 55 245,3 тыс. тенге



13. Реконструкция Канализации в М-2 пос. Н.Майкудук, домоуправление 9 (мкр.12 д.2, 6, 10, 12, 16, 18, 28, 30, 33, 34, 36, 39, 40)



Построен в 1969 году из керамических труб, **износ 100%**

D 150-200 мм, L 1044 м


Транспортирует сточные воды от населения мкр.12

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **2 600 человек**

Стоимость 49 802,9 тыс. тенге



14. Реконструкция Канализации Д/У 1 (пр.Н.Абдирова д.4, 6, 10, 14, 16, ул.Ерубаета, д.45, 47, 47а, 49, пр.Б.Жырау д.52, 52а, 54а, 56, 58, 58а, 60, ул.Можайского д.3, ул.Комиссарова д.26)

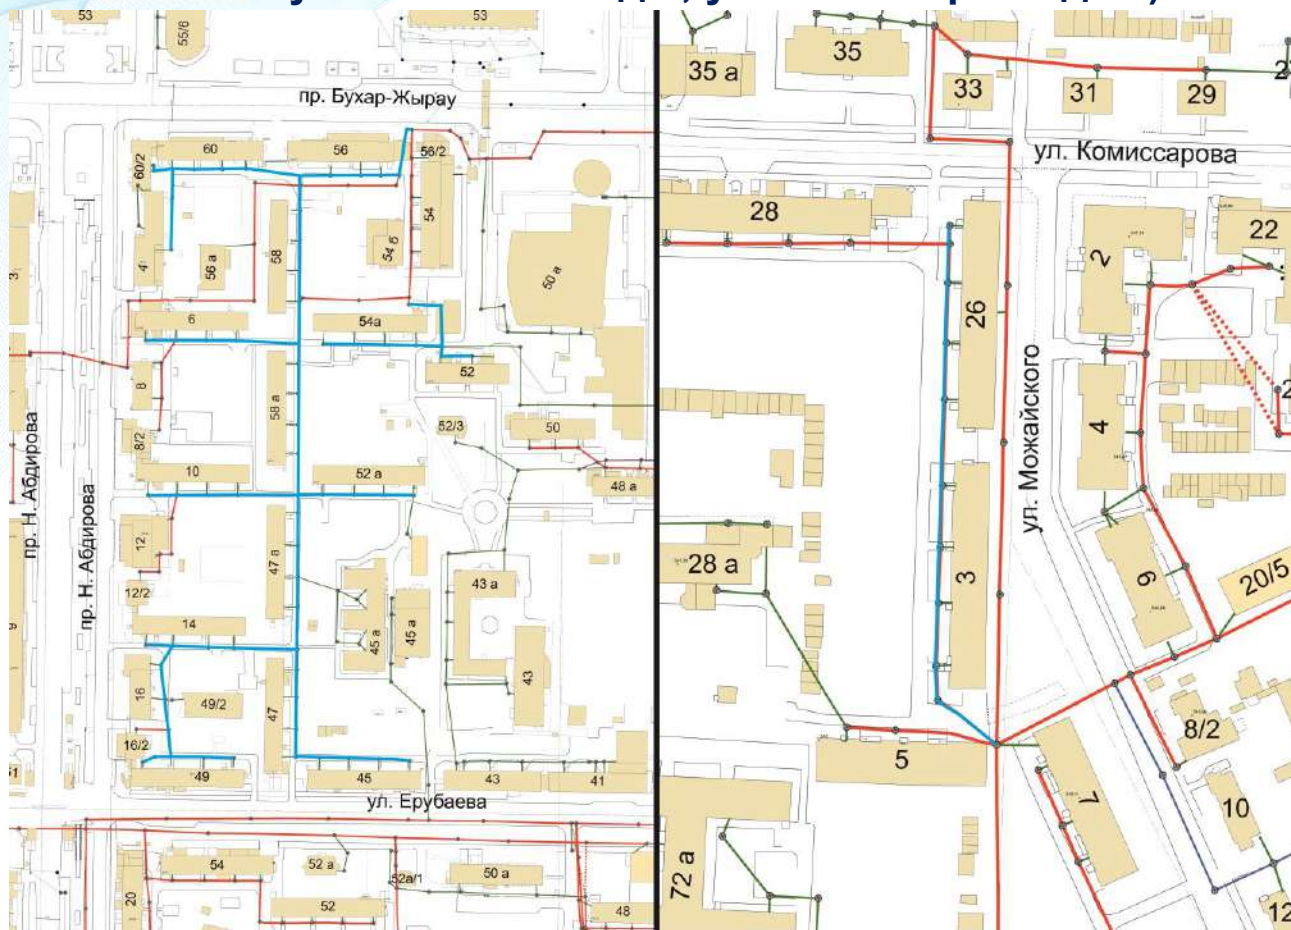

Построен в 1969 году из керамических труб, **износ 100%**

D 160-315 мм, L 1563,9 м

Транспортирует сточные воды от населения и социальных объектов пр.Н.Абдирова, ул.Ерубаета, пр.Б.Жырау, ул.Можайского, ул.Комиссарова .

После реализации данного проекта улучшилось водоотведение около **4 100 человек**

Стоимость 126 874,4 тыс. тенге



Станция Аэрации: Замена напорной задвижки Д-600 с обрезиненным клином с электроприводом

Напорная задвижка диаметром 600 мм
Установлена на насосном агрегате № 1
Станции Аэрации

Установлена взамен старой задвижки.
Старая задвижка отработала свой нормативный срок: электропривод часто выходил из строя, клинья не обеспечивали герметичного запираания канала трубы вследствие износа губок и износа штока и направляющей гайки.

Замена задвижки обеспечивает надежность и эффективность работы станции Аэрации

Стоимость 7 402 тыс. тенге





Приобретения за счет экономии





Приобретения за счет экономии





Приобретения за счет экономии






Реализация инвестиционной программы по услугам водоснабжения и водоотведения в 2024 году позволила

- 1. Улучшить качество услуг водоснабжения и водоотведения**
- 2. Снизить износ сетей:**
 - водоснабжения на 2%**
 - водоотведения на 3%**
- 3. За счет экономии денежных средств при полном исполнении мероприятий**
 - приобрести 17 единиц авто- и спецтехники, 78 единиц оборудования,**
 - произвести капитальный ремонт 7 единиц оборудования и 2 сооружений**
- 4. Увеличить заработную плату сотрудникам**




Кадровая ситуация

Текучесть кадров, %

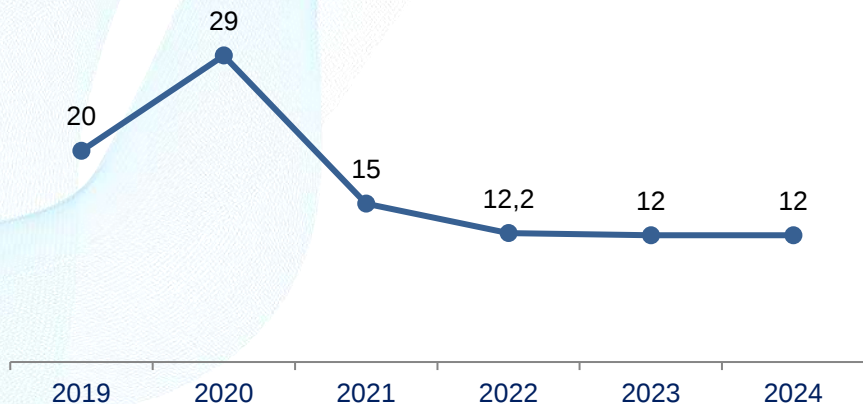


Динамика оплаты труда, тыс. тенге



Структура персонала предприятия

- высшее образование
- среднетехническое образование
- среднеспециальное образование
- среднее образование

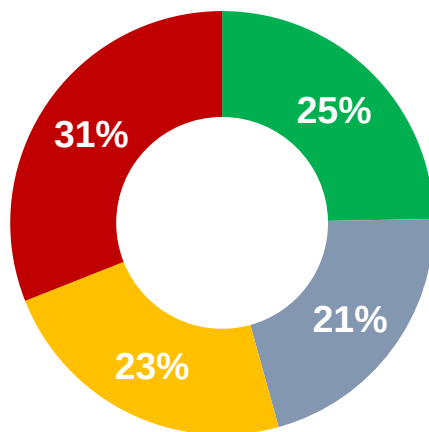

Численность персонала предприятия составляет 1614 человек, в том числе:

- в водоснабжении 969 человек,
- в водоотведении 645 человек

Средний возраст работающих 47 лет

Сотрудники с высшим и средним спец. образованием по специальности «Водопровод и канализация» – 15 чел.



Показатели эффективности, надежности и качества по водоснабжению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2023 г.	План на 2024 г.	Факт 2024 г.	
Снижение физического износа основных фондов (активов), %	61,0%	59,0%	59,0%	исполнено
Снижение потерь, %	13,3%	13,3%	13,1%	исполнено
Снижение аварийности, шт.	1 355	1 320	1 064	исполнено



Показатели эффективности, надежности и качества по водоотведению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2023 г.	План на 2024 г.	Факт 2024 г.	
Снижение физического износа основных фондов (активов), %	85%	82%	82%	исполнено
Снижение засоров, шт.	19 580	20 978	20 485	исполнено



Перспективы деятельности



В 2025 году предстоит исполнить инвестиционные программы на общую сумму 6 млрд. 259 млн. тенге с заменой 55,2 км сетей, в том числе:

- водопроводные сетей протяженностью 36,7 км**
- канализационные сети протяженностью 18,5 км**



В 2025 году планируется начало проекта по реконструкции Канализационных очистных сооружений за счет займа ЕБРР.

Ориентировочная стоимость 55,8 млрд. тенге



Реализация проекта «Реконструкция Блоков основных сооружений 2-ой, 3-ей очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су» в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Стоимость 15,1 млрд. тенге



**Благодарим за
внимание!**

www.kar-su.kz
